

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : COEX - SAINT REVEREND

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Gué-Gorand

Marais :

Nom de l'ouvrage : Lac du Gué-Gorand

Plan de localisation

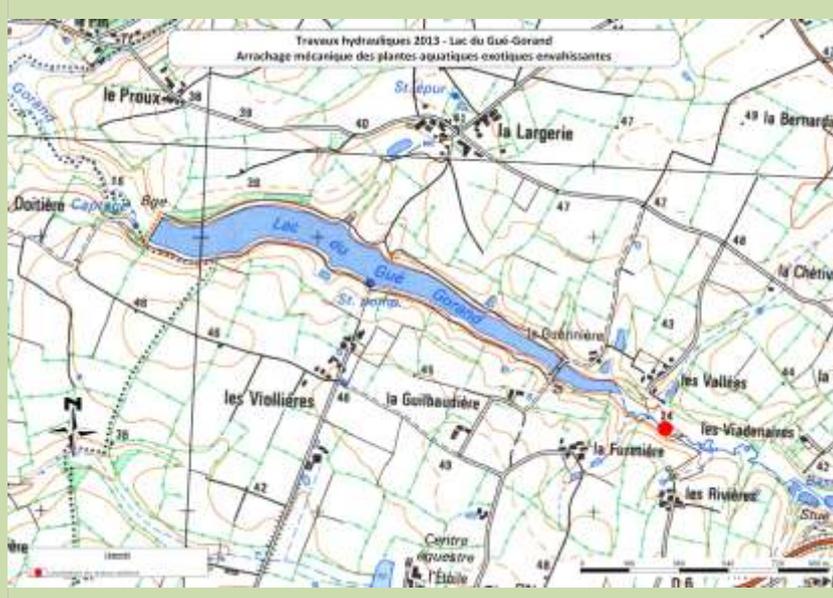


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Arrachage mécanique des PAEE

Linéaire (m) : 8 000 m²

Montant prévisionnel HT : 25 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

3

Les travaux comprennent l'élagage des arbres et l'arrachage mécanique des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) avec exportation.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle : 2013

Année effective : 2013

Début des travaux : 09/09/2013 Fin des travaux : 17/09/2013 Durée effective (jours) : 7

Volume extrait (m3) : 2 000

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	24 305,83 € TTC
Département de la Vendée :	0,00 €
Région des Pays de la Loire :	19 444,66 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	4 861,17 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT REVEREND - L'AIGUILLON SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Gué-Gorand

Marais :

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

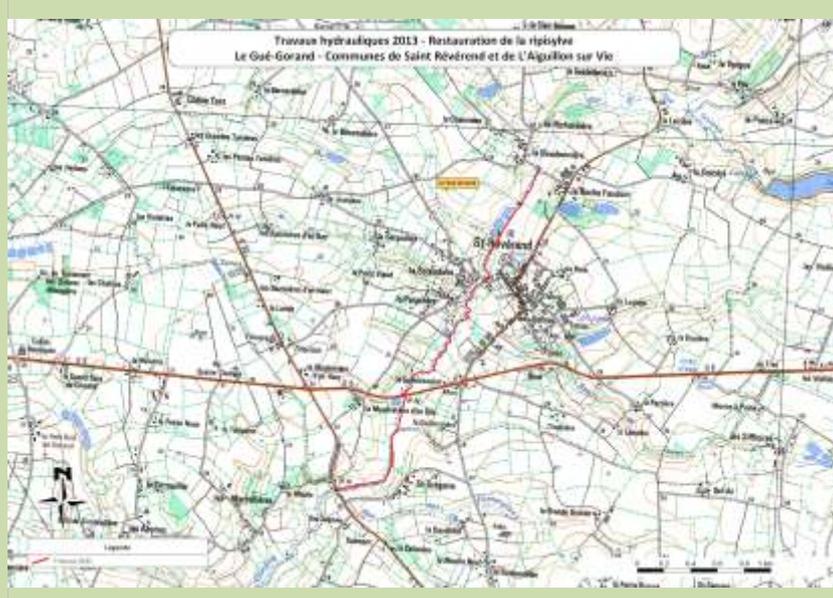


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration de la ripisylve

Linéaire (m) : 4 000

Montant prévisionnel HT : 21 100,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

3

Les travaux comprennent :

- le débroussaillage,
- l'élagage et l'abattage,
- l'enlèvement des embâcles.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle : 2013

Année effective : 2013

Début des travaux : 04/09/2013 Fin des travaux : 18/11/2013 Durée effective (jours) : 52

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	23 784,01 € TTC
Département de la Vendée :	5 965,89 €
Région des Pays de la Loire :	5 708,16 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	7 353,15 €
Autofinancement :	4 756,81 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SOULLANS - CHALLANS - COMMEQUIERS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Lignerou

Marais :

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation



Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration de la ripisylve

Linéaire (m) : 7 000

Montant prévisionnel HT : 36 700,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

3

Les travaux comprennent :

- le débroussaillage,
- l'élagage et l'abattage,
- l'enlèvement des embâcles.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="41 365,22 € TTC"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="10 375,89 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="9 927,66 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="12 788,63 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="8 273,04 €"/>

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage : Le Grand Marais

Plan de localisation

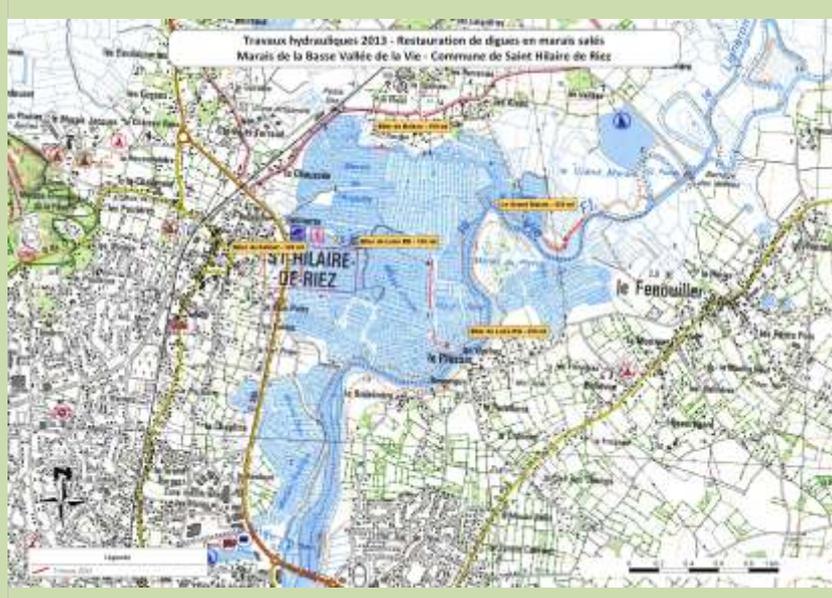


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 420

Montant prévisionnel HT : 17 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (2 100 m³),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (35 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle : 2013

Année effective : 2013

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place (2 600 m³) et la suppression de la mise en œuvre des enrochements.

Début des travaux : 08/07/2013 Fin des travaux : 26/07/2013 Durée effective (jours) : 15

Volume extrait (m³) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	25 463,02 € TTC
Département de la Vendée :	8 516,00 €
Région des Pays de la Loire :	8 176,91 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	8 770,11 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Etier du Salinet

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

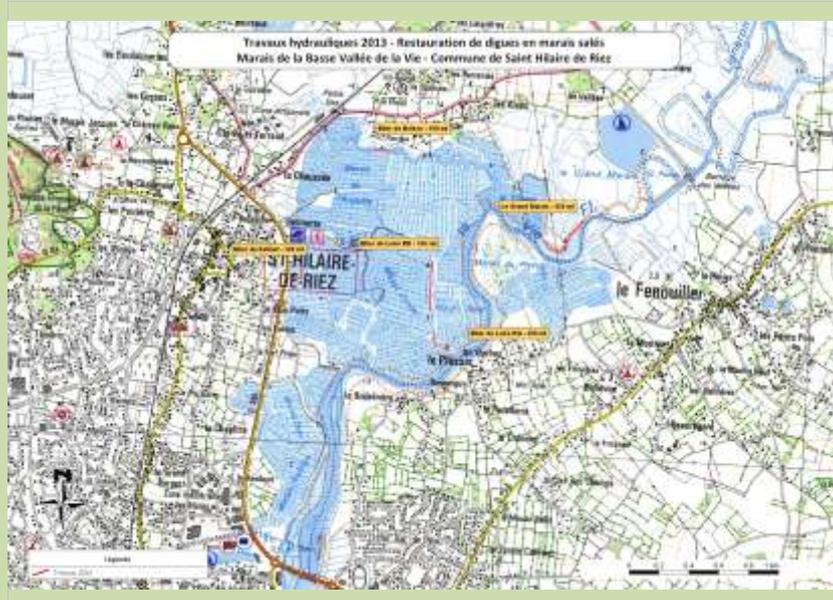


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 160

Montant prévisionnel HT : 8 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (320 m³),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (240 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

Au vu des travaux supplémentaires réalisés sur l'étier de Loire, les travaux envisagés sur l'étier du Salinet n'ont pas été effectués et un avenant au marché a été établi.
Ces travaux seront reportés dans le cadre du prochain contrat.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire :

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

Autofinancement :

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Etier de Baisse - Rive gauche

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

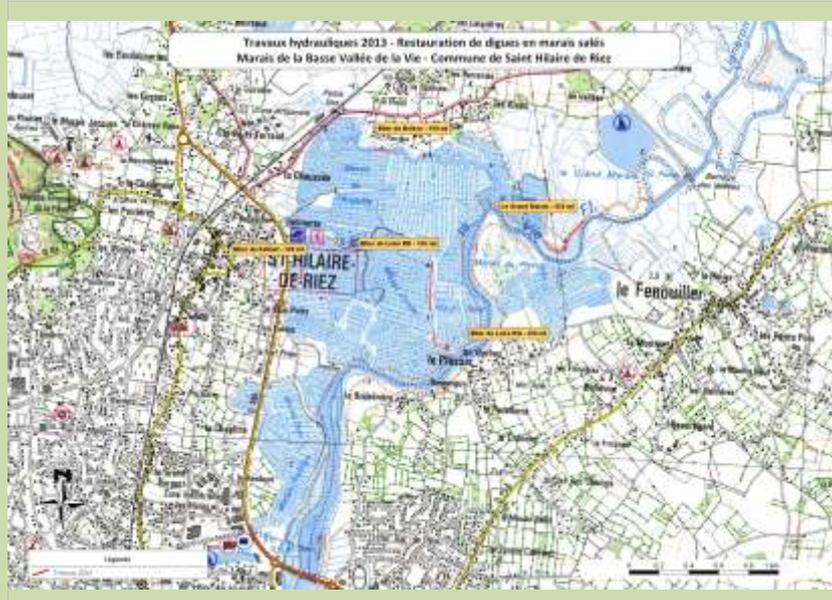


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 100

Montant prévisionnel HT : 9 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (200 m³),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (100 T) et 0,5T/1T (150 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 400 m³ de terre, 80,58 T d'enrochements 100/300 et 98,12 T d'enrochements 0,5T/1T.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m³) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="11 283,70 € TTC"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="3 774,00 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="3 623,52 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="0,00 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="3 886,18 €"/>

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Etier de Loire - Rive gauche

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

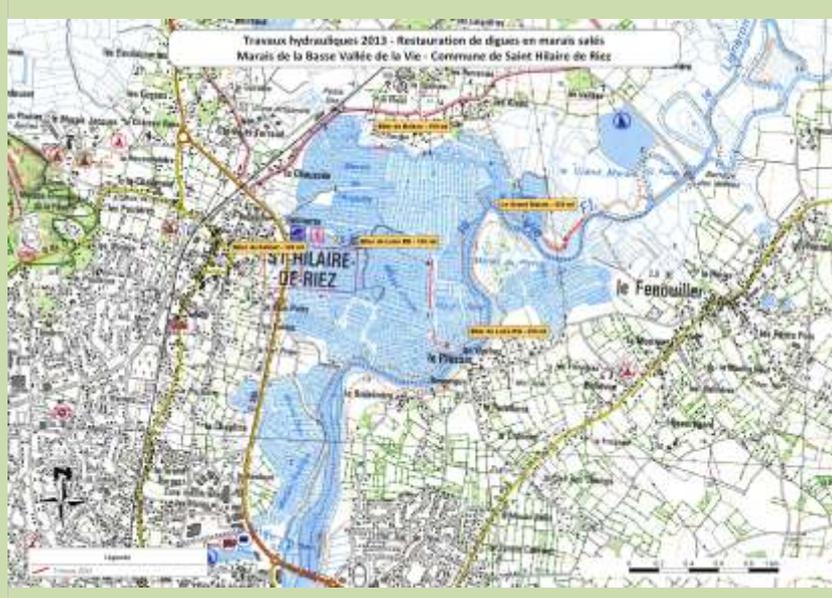


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 200

Montant prévisionnel HT : 18 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues et l'enlèvement des anciens pieux,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (400 m³),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (300 T) et 0,5T/1T (300 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la modification de la quantité d'enrochements, soit au total 940 m³ de terre, 292,18 T d'enrochements 100/300 et 408,72 T d'enrochements 0,5T/1T.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m³) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="29 359,59 € TTC"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="9 819,00 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="9 428,20 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="0,00 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="10 112,39 €"/>

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Etier de Loire - Rive droite

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

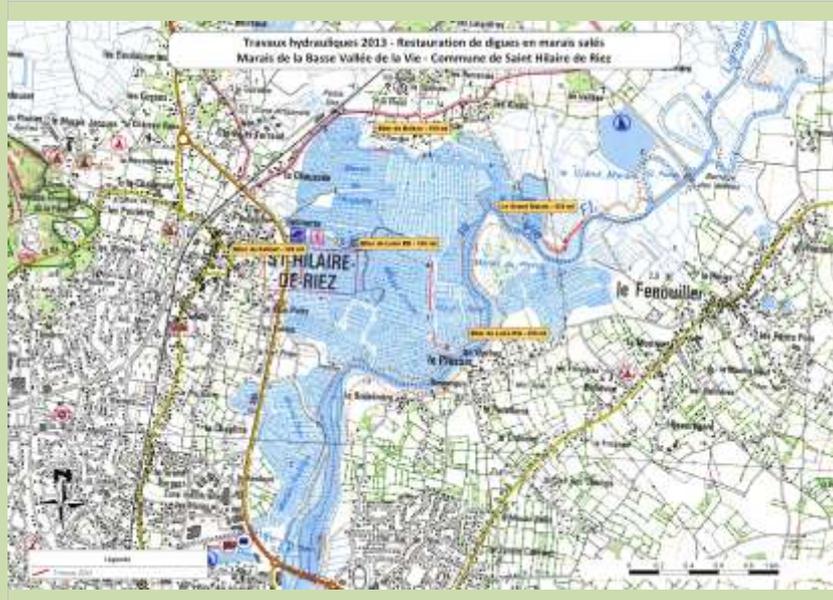


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 300

Montant prévisionnel HT : 23 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (800 m³),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (420 T) et 0,5T/1T (300 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

Un avenant a été effectué pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la modification de la quantité d'enrochements soit au total 1 720 m3 de terre et 138,84 T d'enrochements 100/300 et 283,44 T d'enrochements 0,5T/1T.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="28 559,81 € TTC"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="9 171,37 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="9 552,00 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="0,00 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="9 836,44 €"/>

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : LE FENOILLER

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours de la Franconièrre

Marais : Marais du barrage des Vallées

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

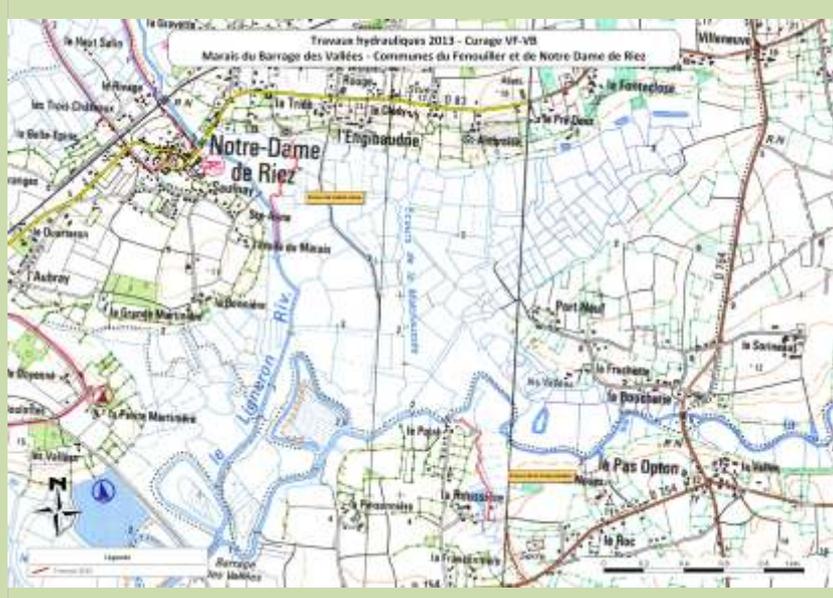


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Curage VF/VB

Linéaire (m) : 1 100

Montant prévisionnel HT : 10 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m bordés ou non de végétation,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

L'association syndicale du barrage des Vallées n'a pas souhaité réaliser ces travaux car ils ne sont pas prioritaires.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire :

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

Autofinancement :

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours de Sainte Anne

Marais : Marais du barrage des Vallées

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

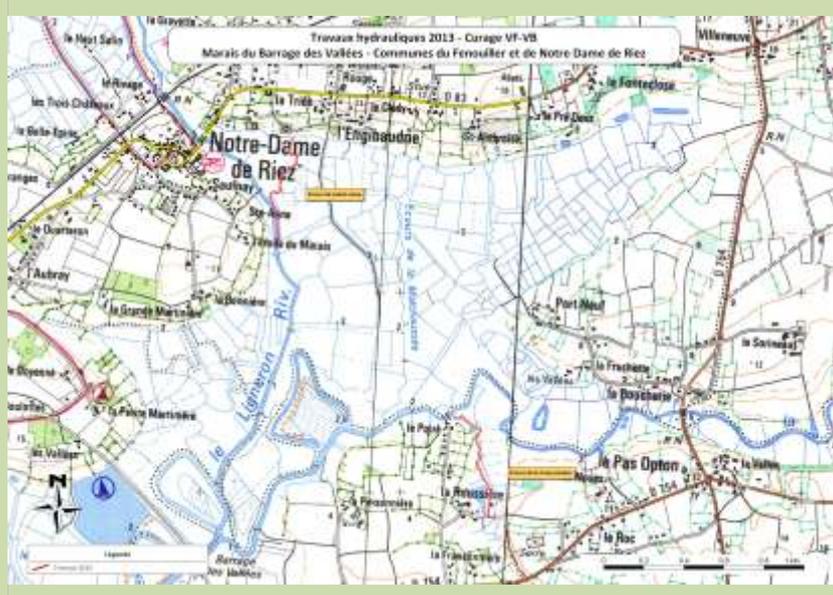


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Curage VF/VB

Linéaire (m) : 700

Montant prévisionnel HT : 6 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 100/300.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

L'association syndicale du barrage des Vallées n'a pas souhaité réaliser ces travaux car ils ne sont pas prioritaires.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire :

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

Autofinancement :

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours de Saulnay, de Sainte Anne 2 et de la Malchaussée

Marais : Marais du barrage des Vallées

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

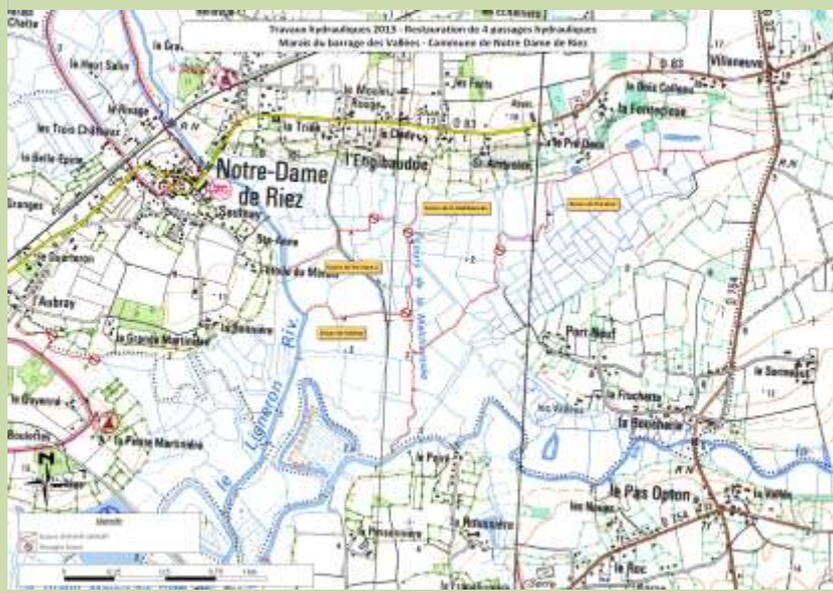


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration de 4 passages hydrauliques

Linéaire (m) :

Montant prévisionnel HT : 3 200,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent la fourniture, le transport et la pose de 4 canalisations PEHD de diamètre 400, 600 et 1000.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="3 688,46 € TTC"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="0,00 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="0,00 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="0,00 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="3 688,46 €"/>

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle : 2013

Année effective : 2013

Un avenant au marché a été établi pour prendre en compte la diminution :

- du nombre de connexions avec les fossés tertiaires,
- du linéaire de canalisation,
- de la quantité de matériaux 100/300 mis en œuvre.

Début des travaux : 30/07/2013 Fin des travaux : 09/08/2013 Durée effective (jours) : 9

Volume extrait (m3) : 16 800

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	27 226,38 € TTC
Département de la Vendée :	6 829,36 €
Région des Pays de la Loire :	6 534,33 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	8 417,41 €
Autofinancement :	5 445,28 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Filatoire, le Grenouillet et la Tuderrière

Marais :

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation



Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Etude sur la restauration de 3 petits cours d'eau

Linéaire (m) :

Montant prévisionnel HT : 65 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

6

L'étude comprend la réalisation d'un état des lieux et d'un diagnostic, la définition d'un programme d'actions avec les dossiers loi sur l'eau et le dispositif de suivi et d'évaluation pour chacun des trois cours d'eau.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle : 2011





Année effective : 2013

Un avenant au marché a été établi afin de prolonger de 3 mois la durée totale d'exécution de l'étude.

Début des travaux : 10/12/2012 Fin des travaux : 20/12/2013 Durée effective (jours) : 167

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	21 444,28 € TTC
Département de la Vendée :	1 793,00 €
Région des Pays de la Loire :	3 586,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	8 965,00 €
Autofinancement :	7 100,28 €

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP





Année prévisionnelle :

Année effective :

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="14 352,00 € TTC"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="1 200,00 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="2 870,40 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="7 176,00 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="3 105,60 €"/>

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP

Année prévisionnelle :

Année effective :

L'étude est actuellement en cours de réalisation et sera achevée en juillet 2014.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :

Département de la Vendée :

Région des Pays de la Loire :

Agence de l'Eau Loire-Bretagne :

Autofinancement :

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau :

Marais :

Nom de l'ouvrage : Ouvrages sur la Vie, le Lignerou, le Gué-Gorand, le Jaunay et l'étier de Baisse

Plan de localisation

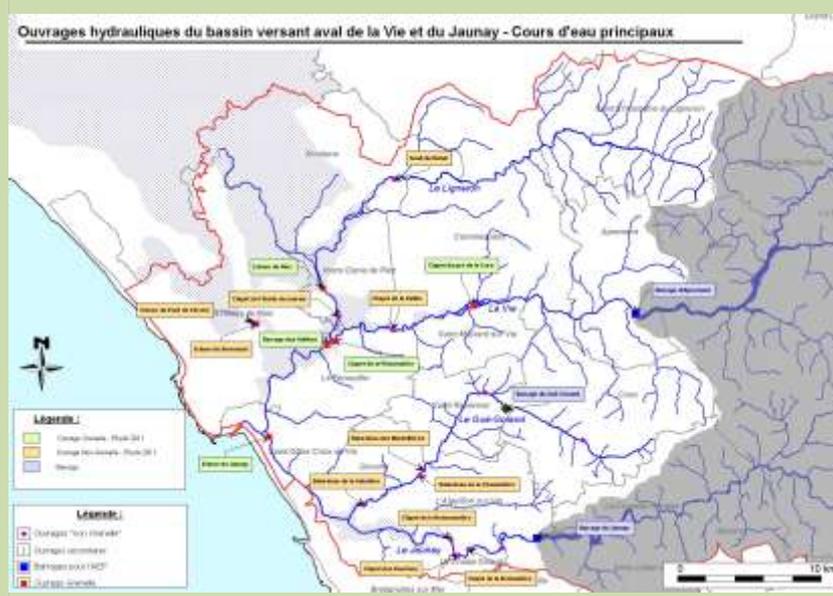


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Etude sur la continuité écologique de 16 ouvrages

Linéaire (m) :

Montant prévisionnel HT : 94 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

18

Cette étude a pour objet de définir en concertation avec les acteurs locaux, les actions pour rétablir la continuité écologique de nos cours d'eau.

Ce travail doit également aboutir sur des règlements de gestion de chaque ouvrage.

Indicateurs de moyens

Action réalisée

Conformité au CCTP




Année prévisionnelle :

Année effective :

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :	<input type="text" value="66 565,00 € HT"/>
Département de la Vendée :	<input type="text" value="4 547,00 €"/>
Région des Pays de la Loire :	<input type="text" value="17 532,00 €"/>
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	<input type="text" value="33 282,50 €"/>
Autofinancement :	<input type="text" value="11 203,50 €"/>
