

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : COEX - SAINT REVEREND

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Gué-Gorand

Marais :

Nom de l'ouvrage : Lac du Gué-Gorand

Plan de localisation

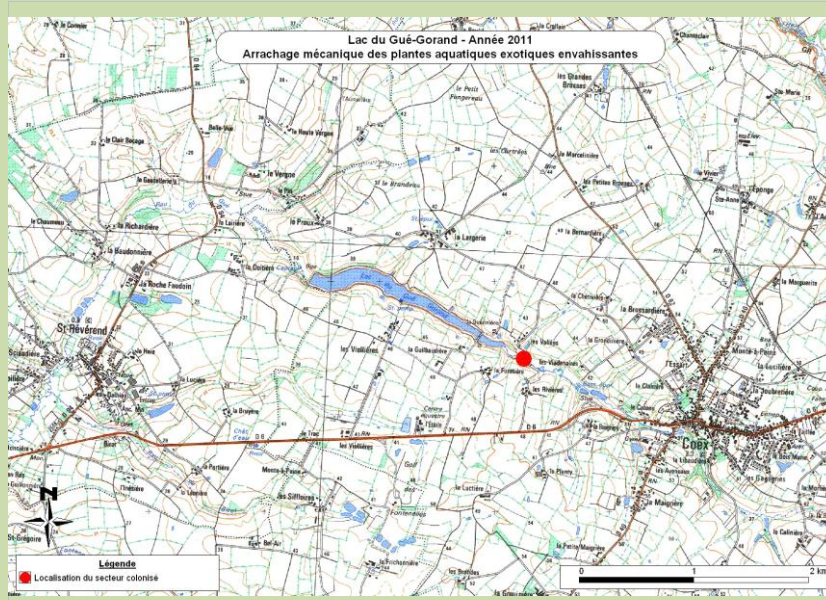


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Arrachage mécanique des PAEE

Linéaire (m) : 1 200 m²

Montant prévisionnel HT : 6 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) : 1

Les travaux comprennent l'égavage des arbres et l'arrachage mécanique des plantes aquatiques exotiques envahissantes avec exportation.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2011

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi afin de prendre en compte une augmentation de la surface d'arrachage mécanique (+ 300 m²) et la suppression de l'élagage des arbres.

Des travaux seront engagés en 2013 sur la partie amont du lac, actuellement envahie à 100 %.

Début des travaux : 24/09/2012 Fin des travaux : 01/10/2012 Durée effective (jours) : 2012

Volume extrait (m3) : 702

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	0,00 €
Région des Pays de la Loire :	2 728,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	1 082,00 €
TOTAL engagé :	3 810,00 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : BRETIGNOLLES SUR MER - LA CHAIZE-GIRAUD

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Jaunay

Marais : Marais du Jaunay et du Gué-Gorand

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

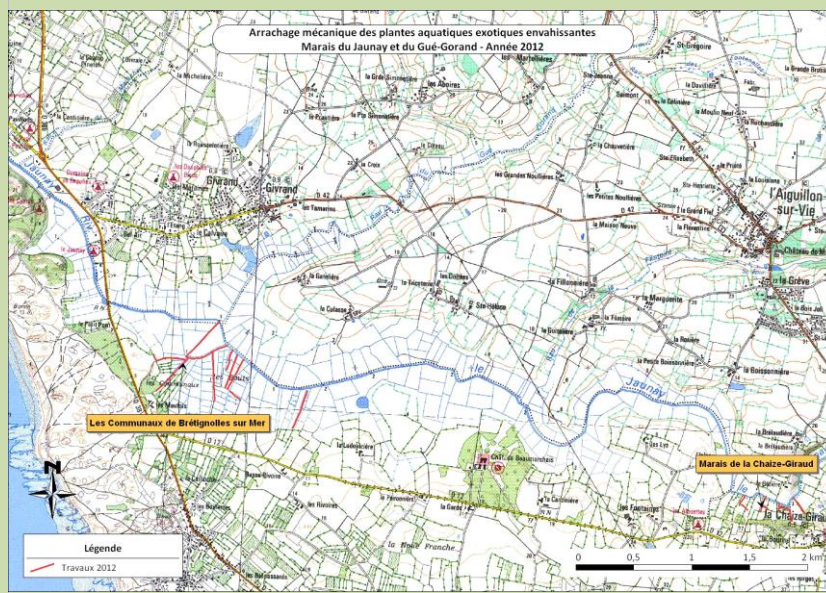


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Arrachage mécanique des PAEE

Linéaire (m) : 3 880

Montant prévisionnel HT : 12 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

2

Les travaux comprennent :

- l'arrachage mécanique des plantes aquatiques exotiques envahissantes sur fossés, avec ou sans végétation et sans exportation,
- le reprofilage de 9 approches.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012


Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi pour diminuer le linéaire d'arrachage mécanique, augmenter le linéaire de fossés bordés de végétation et intégrer un prix d'élagage et d'abattage des arbres.

Début des travaux : 23/07/2012 Fin des travaux : 09/08/2012 Durée effective (jours) : 14

Volume extrait (m3) : 10 067

Reportage photographique

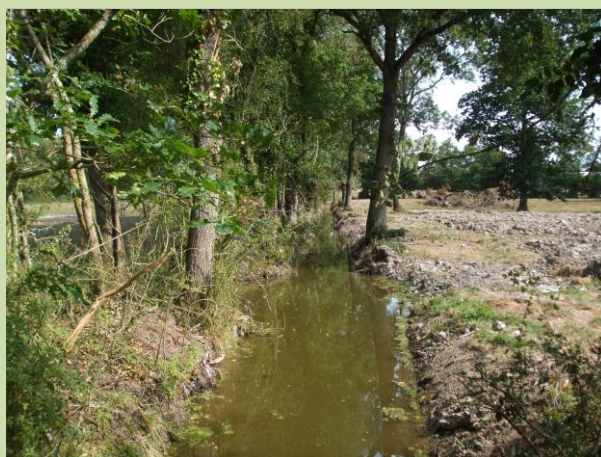

Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	3 366,15 €
Région des Pays de la Loire :	0,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	5 610,25 €
Autofinancement :	2 244,10 €
TOTAL engagé :	11 220,50 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : LE FENOILLER

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage : Marais des Viollières

Plan de localisation

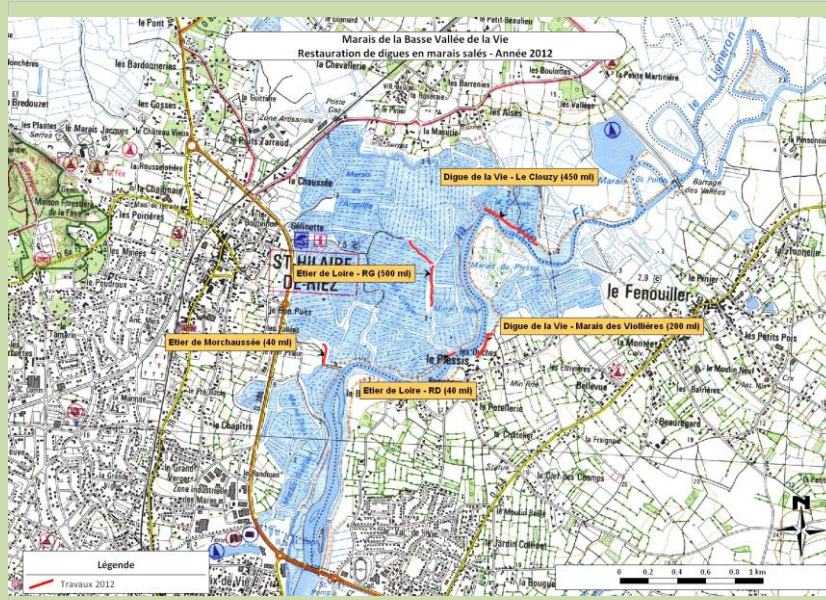


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 200

Montant prévisionnel HT : 10 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (1 000 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (50 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi pour prendre en compte la diminution du volume de terre et d'enrochements mis en place, soit au total 784 m3 de terre et 32,84 T d'enrochements.

Début des travaux : 04/09/2012 Fin des travaux : 05/09/2012 Durée effective (jours) : 2

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	3 159,12 €
Région des Pays de la Loire :	3 159,12 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	1 579,56 €
TOTAL engagé :	7 897,80 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage : Le Clouzy

Plan de localisation

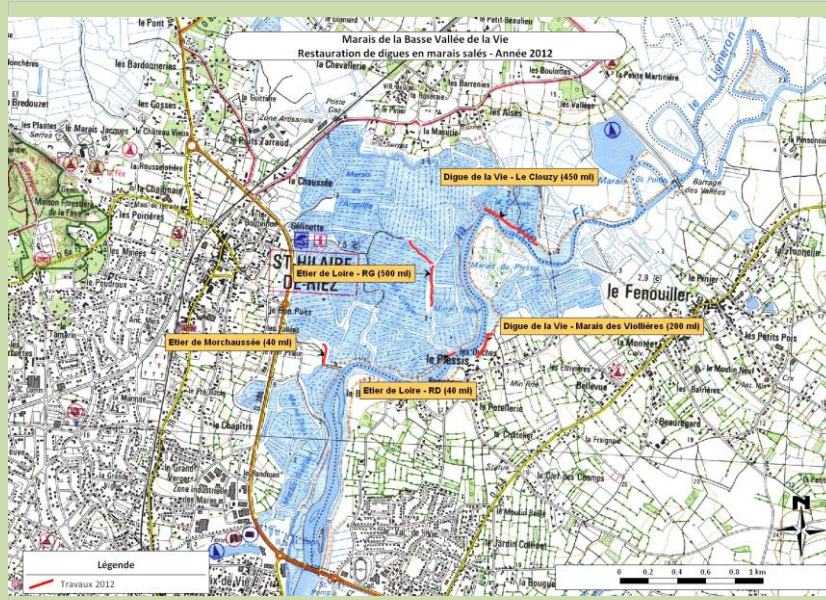


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 450

Montant prévisionnel HT : 14 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (1 350 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (35 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 2 130 m3 de terre et 16,20 T d'enrochements.

Début des travaux : 27/08/2012 Fin des travaux : 03/09/2012 Durée effective (jours) : 6

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	7 525,60 €
Région des Pays de la Loire :	7 525,60 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	3 762,80 €
TOTAL engagé :	18 814,00 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage : Etier de Morchaussée

Plan de localisation

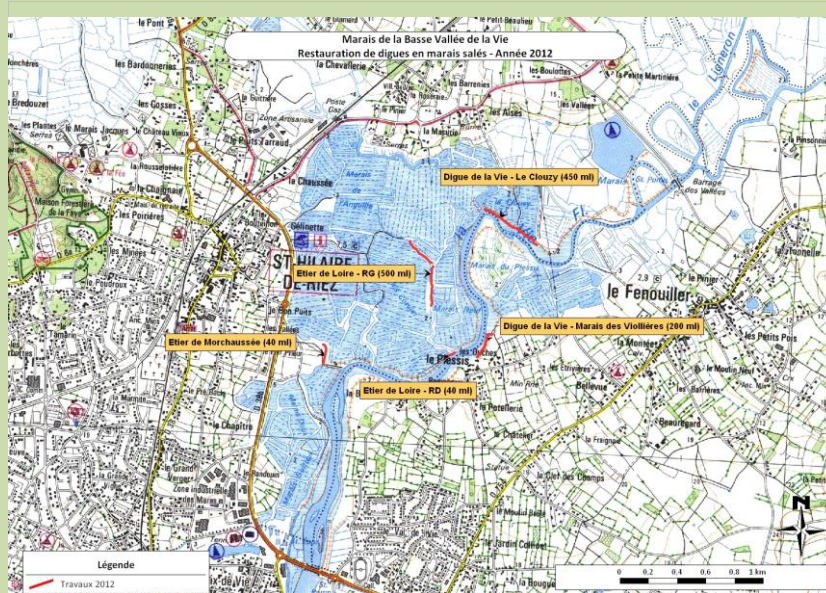


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 40

Montant prévisionnel HT : 5 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (120 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (160 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 315 m³ de terre et 73,44 T d'enrochements.

Début des travaux : 06/09/2012 Fin des travaux : 10/09/2012 Durée effective (jours) : 3

Volume extrait (m³) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	1 912,52 €
Région des Pays de la Loire :	1 912,52 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	956,26 €
TOTAL engagé :	4 781,30 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage : Etier de Loire - Rive gauche

Plan de localisation

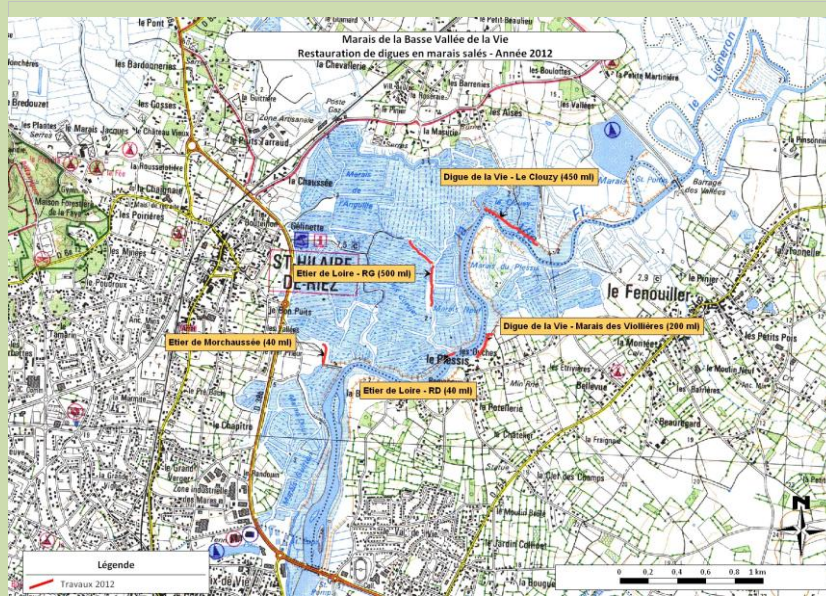


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 415

Montant prévisionnel HT : 40 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (1 500 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (950 T) et 0,5/1 T (420 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☐

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi pour prendre en compte la diminution :

- du linéaire de terrassement (- 85 ml),
- du volume de terre mis en place (- 276 m3),
- de la quantité d'enrochements (- 671,66 T).

Début des travaux : 16/07/2012 Fin des travaux : 30/07/2012 Durée effective (jours) : 11

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	10 149,06 €
Région des Pays de la Loire :	10 149,06 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	5 074,53 €
TOTAL engagé :	25 372,65 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Basse Vallée de la Vie

Nom de l'ouvrage : Etier de Loire - Rive droite

Plan de localisation

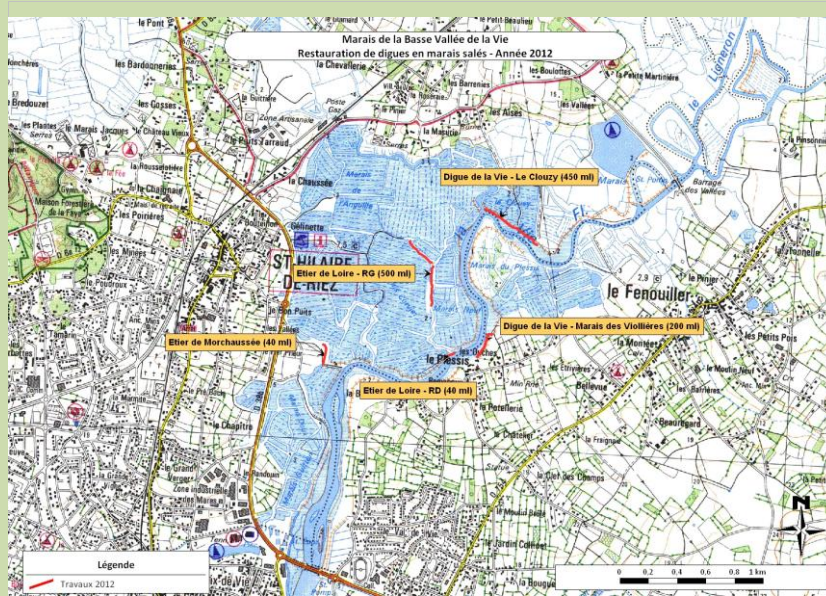


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des digues

Linéaire (m) : 40

Montant prévisionnel HT : 6 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

1

Les travaux comprennent :

- le terrassement général de digues,
- le prélèvement de terre et la mise en œuvre en renforcement de digues (120 m3),
- la mise en place d'enrochements 100/300 (70 T) et 0,5/1 T (70 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi pour prendre en compte l'augmentation du volume de terre mis en place et la diminution de la quantité d'enrochements, soit au total 264 m³ de terre et 95,38 T d'enrochements.

Début des travaux : 30/07/2012 Fin des travaux : 03/08/2012 Durée effective (jours) : 5

Volume extrait (m³) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	2 405,44 €
Région des Pays de la Loire :	2 405,44 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	1 202,72 €
TOTAL engagé :	6 013,60 €

- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture, le transport et la pose de matériaux 0/400.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi afin de prendre en compte la diminution du linéaire de curage et du nombre de connexions avec les fossés tertiaires, et l'augmentation de la quantité de matériaux 0/400.

Début des travaux : 27/08/2012 Fin des travaux : 07/09/2012 Durée effective (jours) : 10

Volume extrait (m3) : 8 660

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	3 000,47 €
Région des Pays de la Loire :	2 000,31 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	3 000,47 €
Autofinancement :	2 000,31 €
TOTAL engagé :	10 001,56 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : LE FENOILLER - COMMEQUIERS - SAINT MAIXENT SUR VIE

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais : Marais de la Vie

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation



Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Curage VF/VB

Linéaire (m) : 1 870

Montant prévisionnel HT : 8 500,00 €

Durée prévisionnelle (mois) : 2

Les travaux comprennent :

- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 0/400.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi afin de prendre en compte la diminution de la quantité de matériaux 0/400 mis en place et l'augmentation du linéaire de curage.

Début des travaux : 10/09/2012 Fin des travaux : 20/09/2012 Durée effective (jours) : 9

Volume extrait (m3) : 7 480

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	2 309,37 €
Région des Pays de la Loire :	1 539,58 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	2 309,37 €
Autofinancement :	1 539,58 €
TOTAL engagé :	7 697,90 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SOULLANS

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Canal de Soullans

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

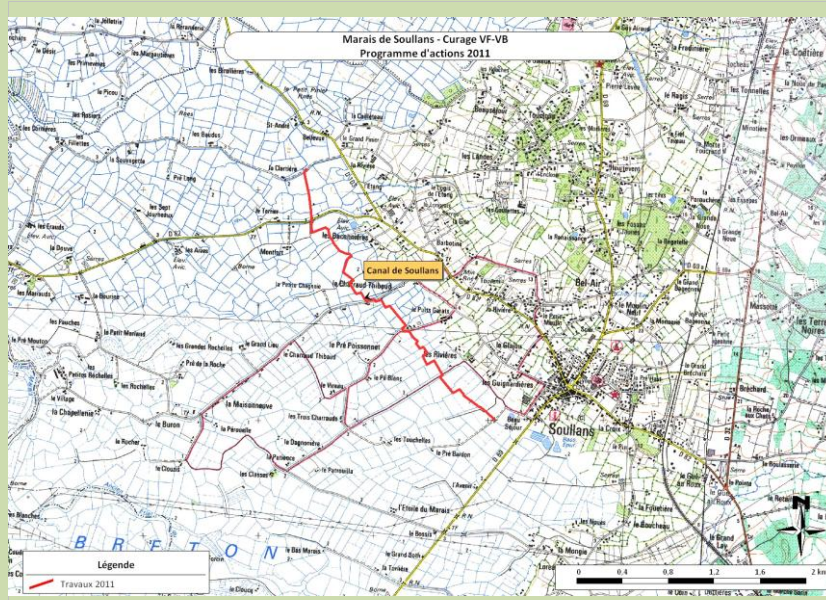


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Curage VF/VB

Linéaire (m) : 3 600

Montant prévisionnel HT : 30 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

2

Les travaux comprennent :

- le curage VF/VB d'écours d'une largeur de 5 à 10 m,
- le curage VF/VB des connexions avec les fossés tertiaires (54 unités),
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements 100/300 kg (300 T).

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2011

Année(s) effective(s) : 2011-2012

Un avenant a été établi pour prendre en compte :

- la diminution du nombre de connexions avec fossés tertiaires,
- l'augmentation du volume d'enrochements mis en place,
- la réalisation d'une protection de berge.

Début des travaux : 03/10/2011 Fin des travaux : 20/09/2012 Durée effective (jours) : 64

Volume extrait (m3) : 21 600

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	5 817,59 €
Région des Pays de la Loire :	3 878,39 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	5 817,59 €
Autofinancement :	3 878,39 €
TOTAL engagé :	19 391,96 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : SAINT HILAIRE DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Ecours du Virgourd

Marais : Marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de Riez

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation

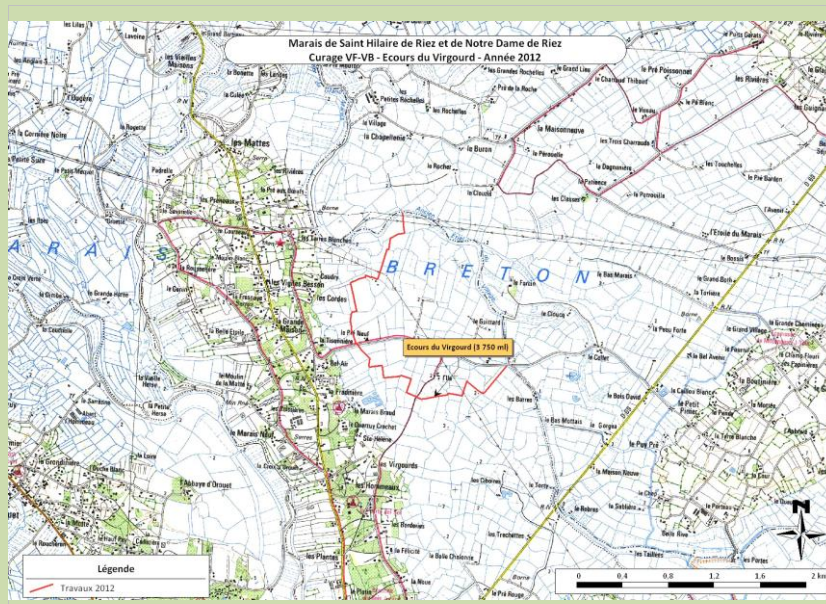


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Curage VF/VB

Linéaire (m) : 3 393

Montant prévisionnel HT : 16 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) : 2

Les travaux comprennent :

- le curage VF/VB d'écours ≤ 5 m,
- le curage des connexions avec les fossés tertiaires,
- la fourniture et la pose de diverses canalisations et de matériaux 0/400.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi afin de prendre en compte la diminution du linéaire de curage, du nombre de connexions avec les fossés tertiaires et de la quantité de matériaux 0/400, et l'augmentation du linéaire de canalisation de diamètre 600.

Début des travaux : 11/09/2012 Fin des travaux : 03/10/2012 Durée effective (jours) : 17

Volume extrait (m3) : 13 572

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	3 517,12 €
Région des Pays de la Loire :	2 344,75 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	3 517,12 €
Autofinancement :	2 344,75 €
TOTAL engagé :	11 723,74 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : NOTRE DAME DE RIEZ

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : Le Ligneron - Ecours de l'Isle

Marais : Marais de Soullans et des Rouches

Nom de l'ouvrage : Ecluses de Riez

Plan de localisation

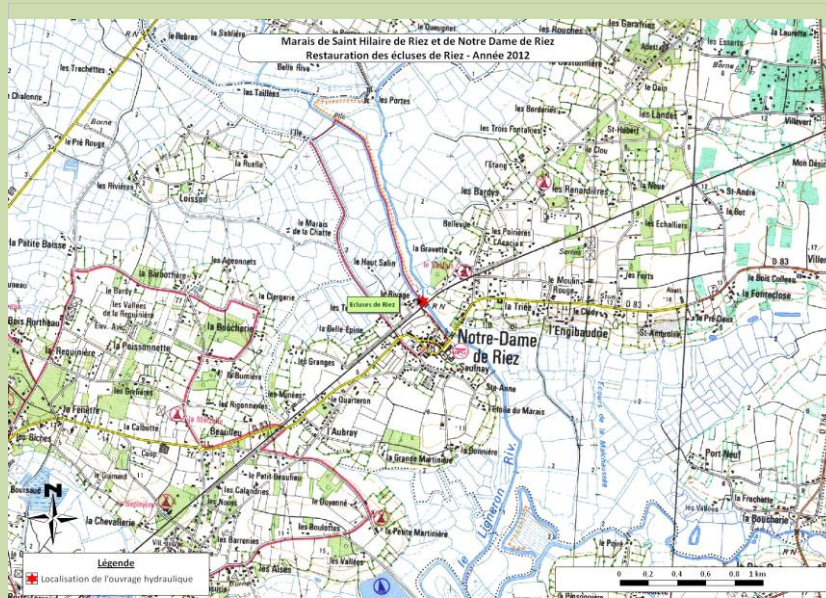


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Restauration des systèmes de manœuvre

Linéaire (m) :

Montant prévisionnel HT : 100 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

2

Les travaux comprennent la dépose, la fourniture et la pose des organes de manœuvre (crics, crémaillères et motoréducteurs). Les quatre motoréducteurs sont remplacés par des servomoteurs avec des fins de course intégrés.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☒

Conformité au CCTP ☒

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) : 2012

Un avenant a été établi afin de mettre en place une seule armoire électrique centralisée pour les commandes.

Début des travaux : 18/10/2012 Fin des travaux : 17/01/2013 Durée effective (jours) : 62

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	0,00 €
Région des Pays de la Loire :	0,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	75 726,00 €
TOTAL engagé :	75 726,00 €

Présentation du site

Nom de l'E cours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Nom de l'ouvrage :	Moulin de Dolbeau
--------------------	-------------------

A detailed topographic map of the Dolbeau area in the Jura region. The map shows the Doubs river flowing through the landscape, with several islands and meanders. Key locations include Dolbeau, la Croix de Vie, la Léonière, les Mouillères, les Chauffetiers, la Florinière, Bellevue, la Guérinière, and Bel-Air. The map also features contour lines, a scale bar (0 to 500 meters), and various symbols for roads, railways, and buildings. A red dot marks a specific location near Dolbeau, and a blue line indicates a path or boundary. The map is oriented with North at the top.

Linéaire (m) :

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de deux vannes en bois, d'une passerelle et de garde-corps, et la démolition partielle de l'ancien ouvrage.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☐

Conformité au CCTP ☐

Année prévisionnelle : 2012





Année(s) effective(s) :

Une seule offre a été déposée pour un montant de 69 670 € HT. Une étude sur la ressource en eau est actuellement en cours et les conclusions de celle-ci pouvant amener une modification des aménagements prévus initialement, les travaux ont été reportés.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique



Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	0,00 €
Région des Pays de la Loire :	0,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	0,00 €
TOTAL engagé :	0,00 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : APREMONT

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : La Vie

Marais :

Nom de l'ouvrage : Moulin de Gourgeau

Plan de localisation

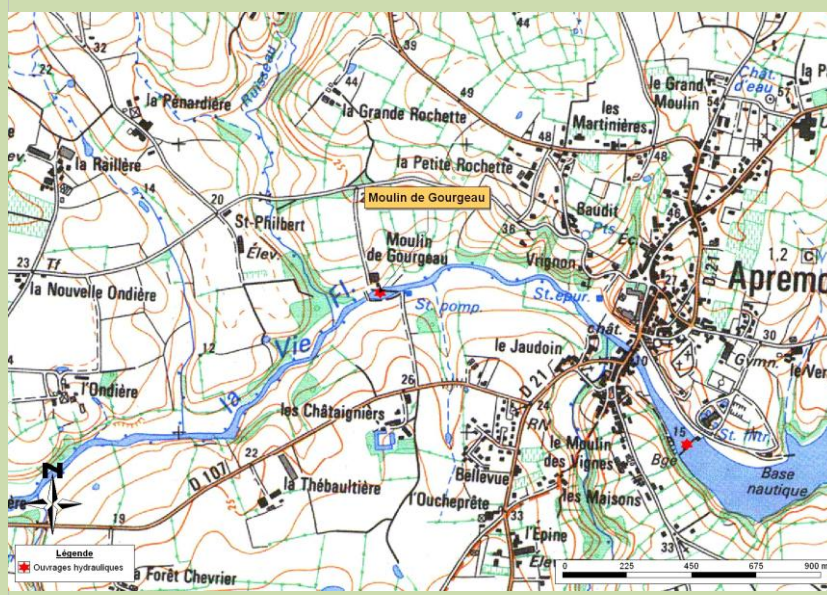


Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Travaux suite aux différentes études

Linéaire (m) :

Montant prévisionnel HT : 72 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

Les travaux consistent à réaliser un aménagement de substitution rustique avec seuils successifs et resserrement du lit.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☐

Conformité au CCTP ☐

Année prévisionnelle : 2012


Année(s) effective(s) :

Suite à la saison hivernale, une brèche s'est formée sur la chaussée en décembre 2011. Une réparation provisoire a été réalisée pour maintenir le niveau d'eau durant la saison estivale 2012. Les travaux d'aménagement prévus initialement ont été reportés.

Début des travaux : Fin des travaux : Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

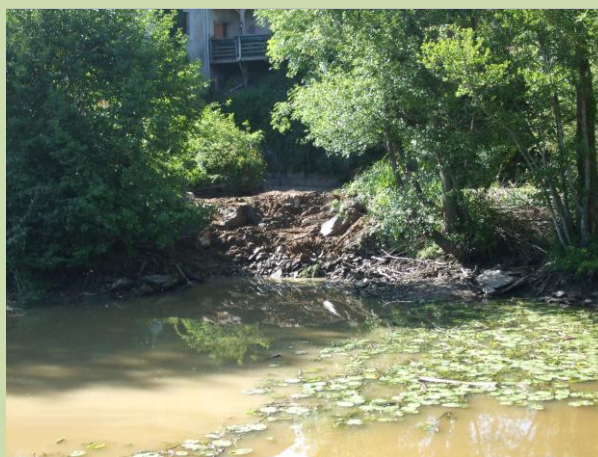

Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	0,00 €
Région des Pays de la Loire :	0,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	3 470,00 €
TOTAL engagé :	3 470,00 €

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAUX HYDRAULIQUES

Présentation du site

Commune(s) : BASSIN VERSANT AVAL DE LA VIE ET DU JAUNAY

Nom de l'Ecours /Etier/Cours d'eau : LA VIE, LE LIGNERON, LE JAUNAY, LE GUE-GORAND


Marais : Marais du territoire du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay

Nom de l'ouvrage :

Plan de localisation



Photo avant travaux



Caractéristiques des travaux prévisionnels

Typologie : Evaluation du CRE 2008-2013

Linéaire (m) :

Montant prévisionnel HT : 15 000,00 €

Durée prévisionnelle (mois) :

6

L'évaluation du Contrat Restauration Entretien "Rivières et Zones Humides" 2008-2013 sera composée d'un volet technico-financier, d'un volet organisationnel et d'un volet technique.

Indicateurs de moyens

Action réalisée ☐

Conformité au CCTP ☐

Année prévisionnelle : 2012

Année(s) effective(s) :

Une consultation est actuellement en cours (février-mars 2013). L'étude sera réalisée durant l'année 2013.

Début des travaux :

Fin des travaux :

Durée effective (jours) :

Volume extrait (m3) :

Reportage photographique

Plan de financement final des travaux H.T.

Conseil Général de la Vendée :	0,00 €
Région des Pays de la Loire :	0,00 €
Agence de l'Eau Loire-Bretagne :	0,00 €
Autofinancement :	0,00 €
TOTAL engagé :	0,00 €
