

Le pilotage des études du SAGE

Exemple du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf

Contexte


National :

32 SAGE en élaboration

50 SAGE en émergence

Local :

MO = Association des
élus locaux

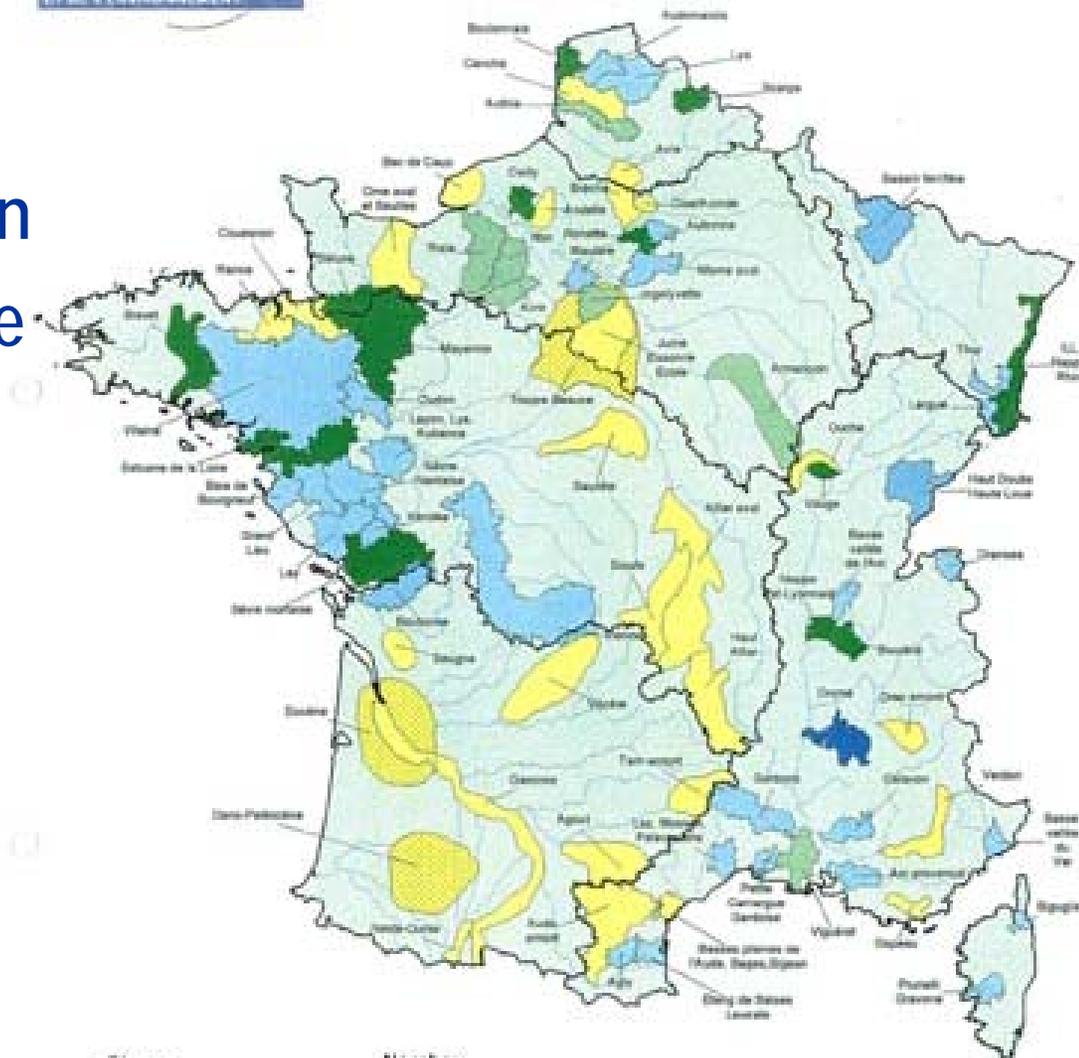

Les structures de travail

- La Commission Locale de l'Eau
 - environ 3 réunions par an – 14 réunions
- Le groupe technique
 - 1 réunion minimum avant chaque CLE
 - Lieu stratégique
- Le groupe communication
 - 11 réunions
 - Apporter du liant

Rôle de l'animateur et du bureau d'étude

- L'animateur
 - Permettre aux membres de la CLE de se réunir et de décider
 - Mise en relation des acteurs
 - Gestion administrative du marché avec le BE
- Le bureau d'étude
 - Recueillir et retraduire les éléments techniques pour permettre leur appropriation et leur compréhension
 - Respect du cahier des charges dans un contexte évolutif

Le cahier des charges

- Une étude pour tout le SAGE
 - 3 tranches
 - Etat des lieux – diagnostic
 - Stratégie
 - Produits et rédaction du SAGE

- Un cahier des charges peu réaliste...
... d'une précision variable

Déroulement de l'étude

- Un état des lieux-diagnostic de qualité
 - avril 99 – juillet 2000 / prévu 6 mois
- Le scénario tendanciel ?
- Quelle « stratégie » ?
 - sept. 00 – mars 2002 / prévu 3 mois
- Rédaction du SAGE
 - avril 2002 – juin 2003

En complément : démarche communication

- Plan de communication – CdC
 - 6 mois
 - Sensibilisation des principaux membres de la CLE
- Sa mise en oeuvre
 - Le SAGE mode d'emploi
 - Le diagnostic illustré
 - Le portrait chinois du SAGE
 - Les lettres ...

Bilan

- Un seul bureau d'étude
 - Continuité
- Un cahier des charges peu respecté
- Mais une étude de qualité
 - Et un budget dépassé pour le BE
 - Mais pas pour le maître d'ouvrage
- Une relation régulière mais difficile entre l'animateur et le BE
- Rédaction du dernier enjeu par l'animateur
