


Bassin Versant de la Bourbonnne

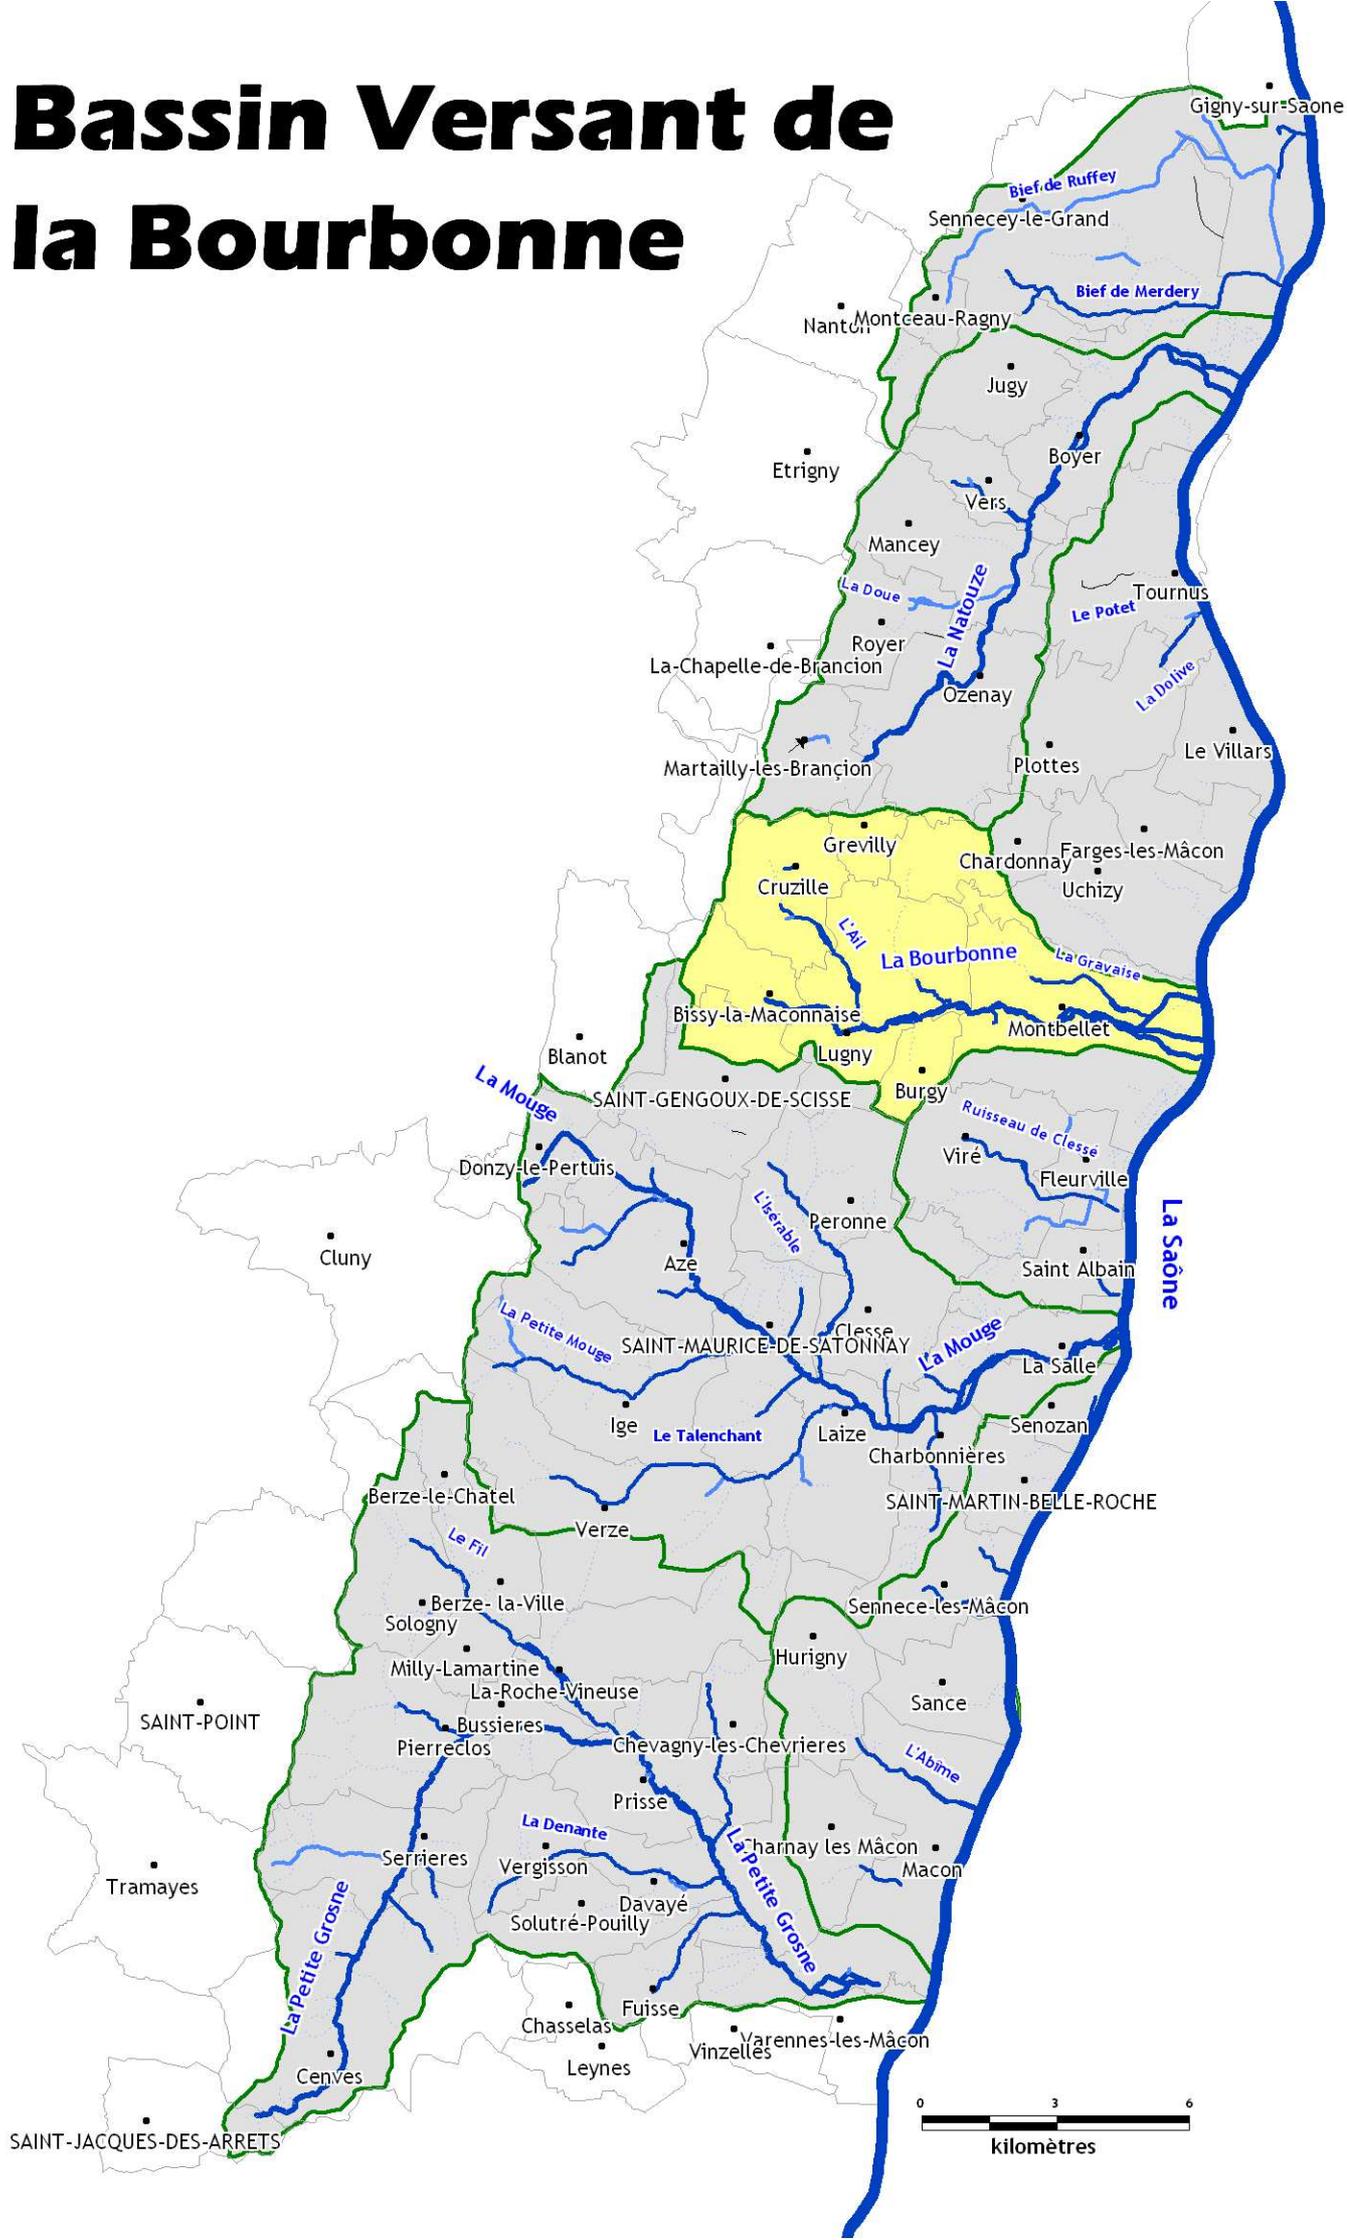

Actions sur le bassin versant de la Bourbonne

Intitulé de l'action	Bassin versant	Code Fiche	Mesure du PDM
Réhabilitation du lagunage de Champvent	La Bourbonne	A1 016	R
Amélioration du réseau du bourg	La Bourbonne	A1 017	R
Mise à jour des documents réglementaires	La Bourbonne	A1 018	R
Amélioration du réseaux de collecte et de transfert	La Bourbonne	A1 019	R
Gestion des effluents non domestiques dans le réseau	Petits affluents	A2 005	R - 5E17
Elaboration d'un plan de gestion des eaux de pluie	La Bourbonne	A4 004	5E04
Elaboration d'un plan de gestion des eaux de pluie	La Bourbonne	A4 005	R - 5E04
Mise en œuvre de la démarche BAC grenelle	La Bourbonne / Petits affluents	A5 004	3A32 / 5F10
Restauration à Collongette	La Bourbonne	B1.1 004	3C43 / 3C07
Restauration sur le ruisseau de Bissy	La Bourbonne	B1.1 005	3C43 / 3C07
Renovation du tunnel sous Lugny	La Bourbonne	B1.2 006	3C43 / 3C07
Protection des entreprises dans la zone d'activité en amont de Lugny	La Bourbonne	B1.3 003	3C43 / 3C07
Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve de la Bourbonne	La Bourbonne	B2.1 014	3C17 / 3C37
Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve de l'Ail et du ruisseau de Fissy	La Bourbonne	B2.1 015	3C17 / 3C37
Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve de la Gravaise	La Bourbonne	B2.1 016	3C17 / 3C37
Amélioration de la continuité du ruisseau de l'Ail	La Bourbonne	B2.3 025	3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
Aménagement de la continuité du ruisseau de Fissy	La Bourbonne	B2.3 026	3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
Aménagement de la continuité du ruisseau de Bissy	La Bourbonne	B2.3 027	3A28 / 3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
Aménagement de la continuité du ruisseau de la Bourbonne	La Bourbonne	B2.3 028	3A28 / 3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
Aménagement de la continuité du ruisseau de la Gravaise	La Bourbonne	B2.3 029	3C11 / 3C12 / 3C13
Restauration au lagunage de Cruzille	La Bourbonne	B2.4 011	3C43 / 3C07
Restauration à Fissy	La Bourbonne	B2.4 012	3C43 / 3C07
Diversification des habitats du ruisseau de l'Ail	La Bourbonne	B2.5 012	3C43
Diversification des habitats du ruisseau de Fissy	La Bourbonne	B2.5 013	3C43
Diversification des habitats du ruisseau de Bissy	La Bourbonne	B2.5 014	3C43
Diversification des habitats de la Bourbonne	La Bourbonne	B2.5 015	3C43
Diversification des habitats du ruisseau de Gravaise	La Bourbonne	B2.5 016	3C43
Gestion des peupliers en bord de cours d'eau	La Bourbonne	B3.4 003	3C17 / 3C37

Volet	Protection de la ressource			Code fiche action	
Thèmes	Assainissement Collectif			A1	016
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	R
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne / Tournus		
Commune(s)	Chardonnay		Département 71	Priorité RM&C	2
Intitulé du projet	Réhabilitation du lagunage de Champvent				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Le système de traitement de la commune est vétuste. De plus, le réseau draine des eaux de pluies qui accentuent les pertes au milieu

Objectifs :

- Réflexion sur l'amélioration de la lagune de Champvent
- Améliorer la gestion des eaux pluviales dans les réseaux
-

Conditions d'exécution :

- Existence d'un Schéma Directeur d'Assainissement
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration du rendement épuratoire
- Amélioration de la qualité des eaux
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
76> Réalisation d'un schéma directeur / Reflexion sur l'amélioration de la lagune de Champvent	2012	15000	17940
77> Gestion des eaux pluviales ou météoritiques dans le réseau de Champvent	2013	25000	29900
78> Réhabilitation de la station de Champvent si nécessaire	2014		0
79>			0
80>			0
Total		40000	47840

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle						
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre
1>	2012	17940	50 %	50 %	%	%	%	%	%
2>	2013	29900	50 %	50 %	%	%	%	%	%
3>	2014	0	100 %	0 %	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%	%
		Participations	20000	20000	0	0	0	0	0
Total		47840	dont	20000			de participations		

Maitrise d'ouvrage

Commune de Chardonnay

Conditionnement des aides :

- Schéma d'assainissement
-

Volet	Protection de la ressource			Code fiche action	
Thèmes	Assainissement Collectif			A1	017
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	R
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne / Tournus		
Commune(s)	Chardonnay		Département 71	Priorité RM&C	2
Intitulé du projet	Amélioration du réseau du bourg				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Le système de traitement de la commune est vétuste. De plus, le réseau draine des eaux de pluies qui accentuent les pertes au milieu

Objectifs :

- Réflexion sur l'amélioration du réseau du bourg
- Améliorer la gestion des eaux de pluie dans les réseaux
-

Conditions d'exécution :

- Existence d'un Schéma Directeur d'Assainissement
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration du rendement épuratoire
- Amélioration de la qualité des eaux
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
81> Mise en place d'une convention de raccordement (Domaine Montlaville / Les Eclaireurs de France)	2012		0
82> Gestion des eaux pluviales ou météoritiques dans le réseau du bourg	2013	25000	29900
83>			0
84>			0
85>			0
	Total	25000	29900

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle						
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre
1>	2012	0	100 %	0 %	%	%	%	%	%
2>	2013	29900	50 %	50 %	%	%	%	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%	%
		Participations	12500	12500	0	0	0	0	0
Total		29900	dont	12500			de participations		

Maitrise d'ouvrage

Commune de Chardonnay

Conditionnement des aides :

- Schéma d'assainissement
-

Volet	Protection de la ressource			Code fiche action	
Thèmes	Assainissement Collectif			A1	018
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	R
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Grevilly		Département 71	Priorité RM&C	3
Intitulé du projet	Mise à jour des documents réglementaires				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

La commune ne possède pas de document réglementaire concernant l'assainissement

Objectifs :

- Elaborer un zonage
- Elaboration d'un Schéma Directeur d'Assainissement
-

Conditions d'exécution :

-
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration du traitement des eaux usées
-
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
86> Elaborer un zonage d'assainissement	2012	250	299
87> Elaboration d'un Schéma Directeur d'assainissement	2013	500	598
88>			0
89>			0
90>			0
	Total	750	897

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle							
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre	
1>	2012	299	100 %	0 %	%	%	%	%	%	
2>	2013	598	50 %	50 %	%	%	%	%	%	
3>		0	%	%	%	%	%	%	%	
4>		0	%	%	%	%	%	%	%	
5>		0	%	%	%	%	%	%	%	
		Participations	500	250	0	0	0	0	0	
Total		897	dont	250			de participations			

Maitrise d'ouvrage

Commune de Grevilly

Conditionnement des aides :

- Zonage d'assainissement
-

Volet	Protection de la ressource			Code fiche action	
Thèmes	Assainissement Collectif			A1	019
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	R
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Sivom de Lugny, St Gengoux de Scissé, Bissy la Maconnaise, Burgy, Lugny, Montbellet		Département 71	Priorité RM&C	1
Intitulé du projet	Amélioration du réseaux de collecte et de transfert				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Le réseau d'assainissement est sujet à des volumes importants d'eaux parasites en période d'étiage. En période pluvieuse, ces volumes sont accrus. L'ensemble perturbe le fonctionnement du réseau en partie unitaire pourvu de plusieurs déversoirs d'orage.

Objectifs :

- Mise à jour du schéma directeur et diagnostic complet du réseau (existant incomplet)
- Inventaire des regards et états
- Réhabilitation des secteurs endommagés

Conditions d'exécution :

- Elaboration d'un Schéma Directeur d'Assainissement

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration de la qualité des eaux
- Amélioration du rendement épuratoire

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
91> Mise à jour du schéma d'assainissement, diagnostic du réseau, mesure de débit et inventaire des regards	2012	50000	59800
92>			0
93>			0
94>			0
95>			0
Total		50000	59800

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle						
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre
1>	2012	59800	70 %	30 %	%	%	%	%	%
2>		0	%	%	%	%	%	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%	%
		Participations	35000	15000	0	0	0	0	0
Total		59800	dont	15000			de participations		

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de lugny

Conditionnement des aides :

- Schéma d'assainissement
-

Volet	Protection de la ressource			Code fiche action	
Thèmes	Gestion des eaux pluviales			A4	004
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	5E04
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Montbellet		Département 71	Priorité RM&C	1
Intitulé du projet	Elaboration d'un plan de gestion des eaux de pluie				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Les eaux de pluie provoquent des perturbations sur les chaussées. Leur évacuation pose également des problèmes en période de hautes eaux.

Objectifs :

- Elaborer un plan de gestion des eaux de pluie
-
-

Conditions d'exécution :

- Existence d'un schéma directeur d'assainissement
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration de la qualité des eaux
-
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
16> Elaborer un schéma des eaux pluviales	2013	10000	11960
17>			0
18>			0
19>			0
20>			0
	Total	10000	11960

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle							
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre	
1>	2013	11960	50 %	50 %	%	%	%	%	%	
2>		0	%	%	%	%	%	%	%	
3>		0	%	%	%	%	%	%	%	
4>		0	%	%	%	%	%	%	%	
5>		0	%	%	%	%	%	%	%	
		Participations	5000	5000	0	0	0	0	0	
Total		11960	dont	5000			de participations			

Maitrise d'ouvrage

Commune de Montbellet

Conditionnement des aides :

- Schéma d'assainissement
-

Volet	Protection de la ressource			Code fiche action	
Thèmes	Gestion des eaux pluviales			A4	005
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	R - 5E04
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Lugny		Département 71	Priorité RM&C	3
Intitulé du projet	Elaboration d'un plan de gestion des eaux de pluie				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Le réseau unitaire collecte un volume important d'eau de pluie. Les déversoirs d'orage déversent ensuite une partie du flux au ruisseau.
Absence de plan de recollement du réseau d'eau de pluie

Objectifs :

- Elaborer un plan de gestion des eaux de pluie
-
-

Conditions d'exécution :

- Existence d'un schéma directeur d'assainissement
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration de la qualité des eaux
- Amélioration du rendement épuratoire
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
21> Elaborer un schéma de eaux pluviales	2013	3500	4186
22>			
23>			
24>			
25>			
Total		3500	4186

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle						
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre
1>	2013	4186	70 %	30 %	%	%	%	%	%
2>			%	%	%	%	%	%	%
3>			%	%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%	%
		Participations	2450	1050	0	0	0	0	0
Total		4186	dont	1050			de participations		

Maitrise d'ouvrage

Commune de Lugny

Conditionnement des aides :

- Schéma d'assainissement
-

Volet	Protection de la Ressource			Code fiche action	
Thèmes	BAC et SIE			A5	004
Bassin versant	La Bourbonne / Petits affluents			Mesures du PDM	3A32 / 5F10
ME Souterraine	305C / 503	Cours d'eau			
Syndicat	SIE du Haut Mâconnais		Département 71		
Intitulé du projet	Mise en œuvre de la démarche BAC grenelle				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Les captages de Farges les Mâcon et de Montbellet sont classés captages Grenelle. Une démarche BAC est donc obligatoire. Les périmètres de protection sont en cours de validation. La construction d'un nouveau puit est envisagée sur Montbellet.

Objectifs :

- Démarche BAC : définir un programme d'actions agricoles
- Démarche BAC : définir un programme d'actions non-agricoles
- Définir une stratégie d'acquisition foncière

Conditions d'exécution :

-
-
-

Indicateurs d'efficacité :

-
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
16> Elaborer un programme d'actions	2012		0
17> Mise en œuvre du programme	2013	0	
18> Rénovation des canalisations d'adduction (250 000 €/an)	0	1250000	1495000
19> Création d'un nouveau puits de captage sur Montbellet	2014	400000	478400
20>			0
	Total		0

Remarque

Action reprise par le contrat Saône

Volet	Protection des biens et des personnes			Code fiche action	
Thèmes	Restauration des champs d'expansion			B1.1	004
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43 / 3C07
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Restauration à Collongette				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de l'Ail a été rectifié à Collongette à deux endroits, et le secteur en aval est sensible aux inondations

Objectifs :

- Restauration physique de l'Ail
- Restauration des champs d'expansion
- Ralentissement des crues

Plan de situation

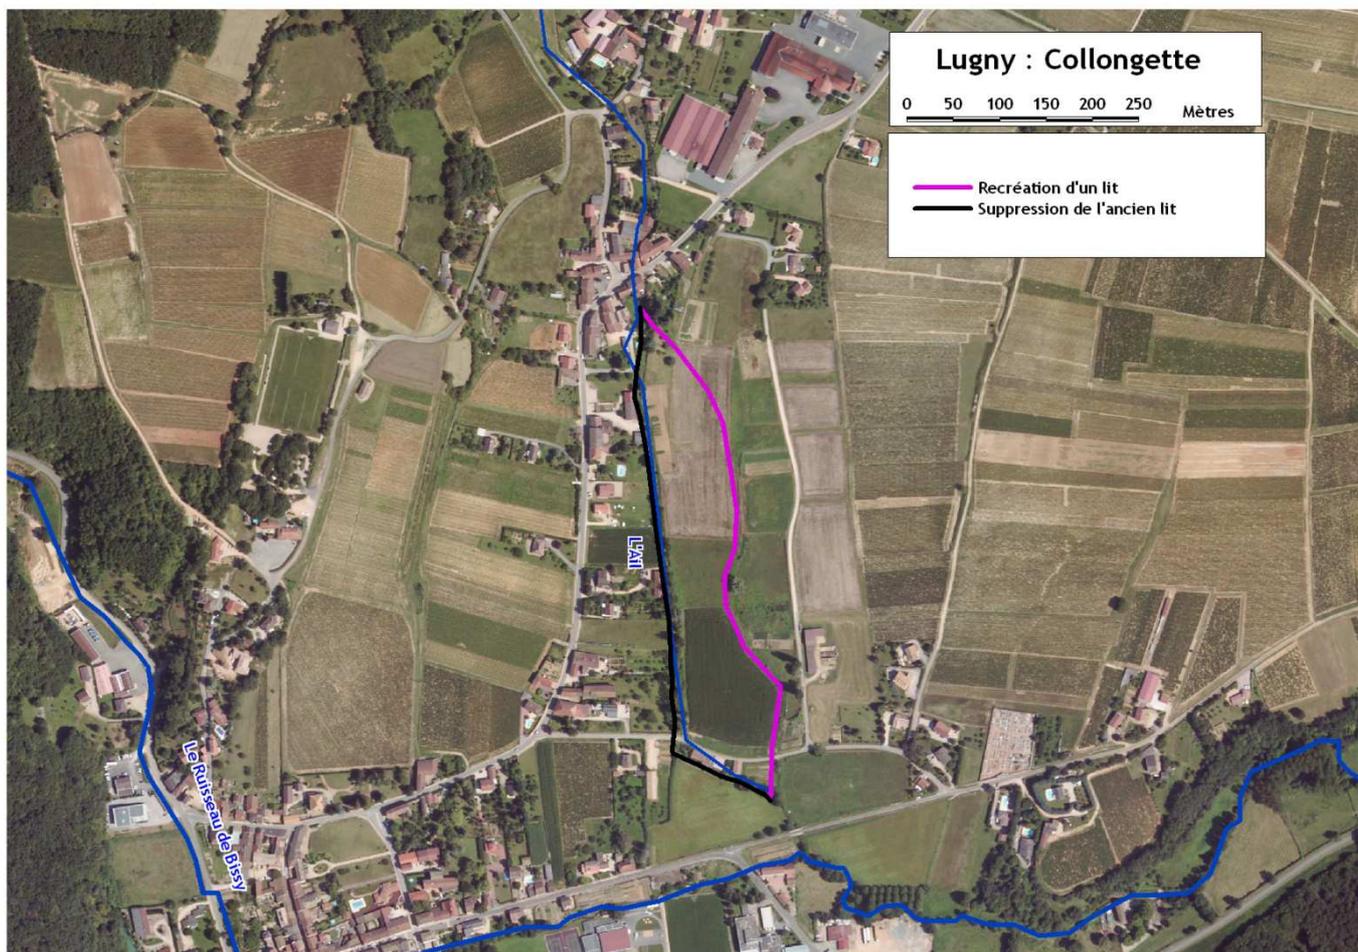

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
- Intérêt sur la réduction des crues

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire - limitation du colmatage
- Limitation du colmatage

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
	16> Etude de définition du projet	2012	15000
17> Maîtrise foncière des sites	2013	15000	17940
18> Mise en œuvre de la restauration	2013	70500	84318
19>			0
20>			0
Total		100500	120198

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	17940	50 %	50 %	%	%	%	%
2>	2013	17940	20 %	80 %	%	%	%	%
3>	2013	84318	20 %	50 %	%	30 %	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	24600	54750	0	21150	0	0
Total		120198	dont	19500			de participations	

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Protection des biens et des personnes			Code fiche action	
Thèmes	Restauration des champs d'expansion			B1.1	005
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43 / 3C07
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Bissy la Mâconnaise / Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Restauration sur le ruisseau de Bissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

A l'amont de Lugny le ruisseau de Bissy est totalement rectifié sur plusieurs centaines de mètres et le secteur aval est sensible aux inondations

Objectifs :

- Restauration physique du ruisseau de Bissy
- Restauration des champs d'expansion
- Ralentissement des crues

Plan de situation

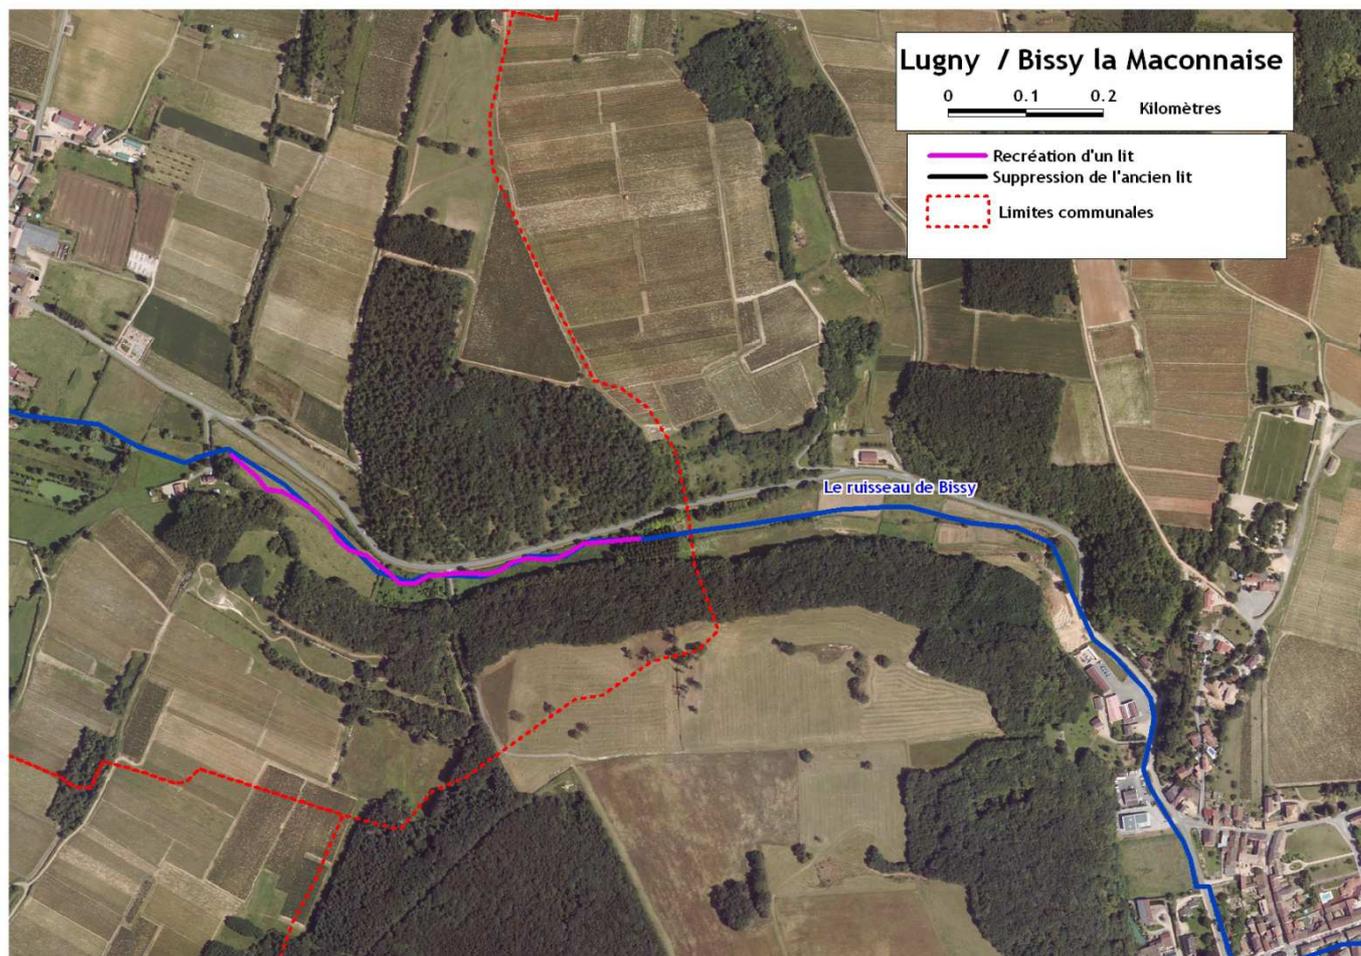

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
- Intérêt sur la réduction des crues

Indicateurs d'efficacité :

- Réduction du colmatage
- Augmentation des indices biologiques

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
21> Etude de définition du projet (prendre en compte le reprofilage possible à l'aval)	2012	10000	11960
22> Maîtrise foncière du site	2014	30000	35880
23> Mise en œuvre des deux tronçons de restauration	2014	58097	69484
24>			0
25>			0
Total		98097	117324

Plan de financement et clé de répartition :								
	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	11960	50 %	50 %	%	%	%	%
2>	2014	35880	20 %	80 %	%	%	%	%
3>	2014	69484	20 %	50 %	%	30 %	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	22619	58049	0	174290	0	0
Total		117324	dont	75478			de participations	

Maitrise d'ouvrage	Sivom du canton de Lugny
Conditionnement des aides :	
<ul style="list-style-type: none"> - Approche globale nécessaire - Bonification possible selon ambition 	

Volet	Protection des biens et des personnes			Code fiche action	
Thèmes	Traversée de bourg délicate			B1.2	006
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43 / 3C07
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Bissy la Mâconnaise / Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Renovation du tunnel sous Lugny				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Les deux tronçons de tunnel sous Lugny sont sujets à l'érosion. Ils présentent des dégradations majeures sur les murs de soutènement. De plus le fond du lit et très peu diversifié.

Objectifs :

- Rénovation des murs latéraux
- Suppression du risque d'éboulement
- Aménagement du lit mineur, lit d'étiage

Plan de situation

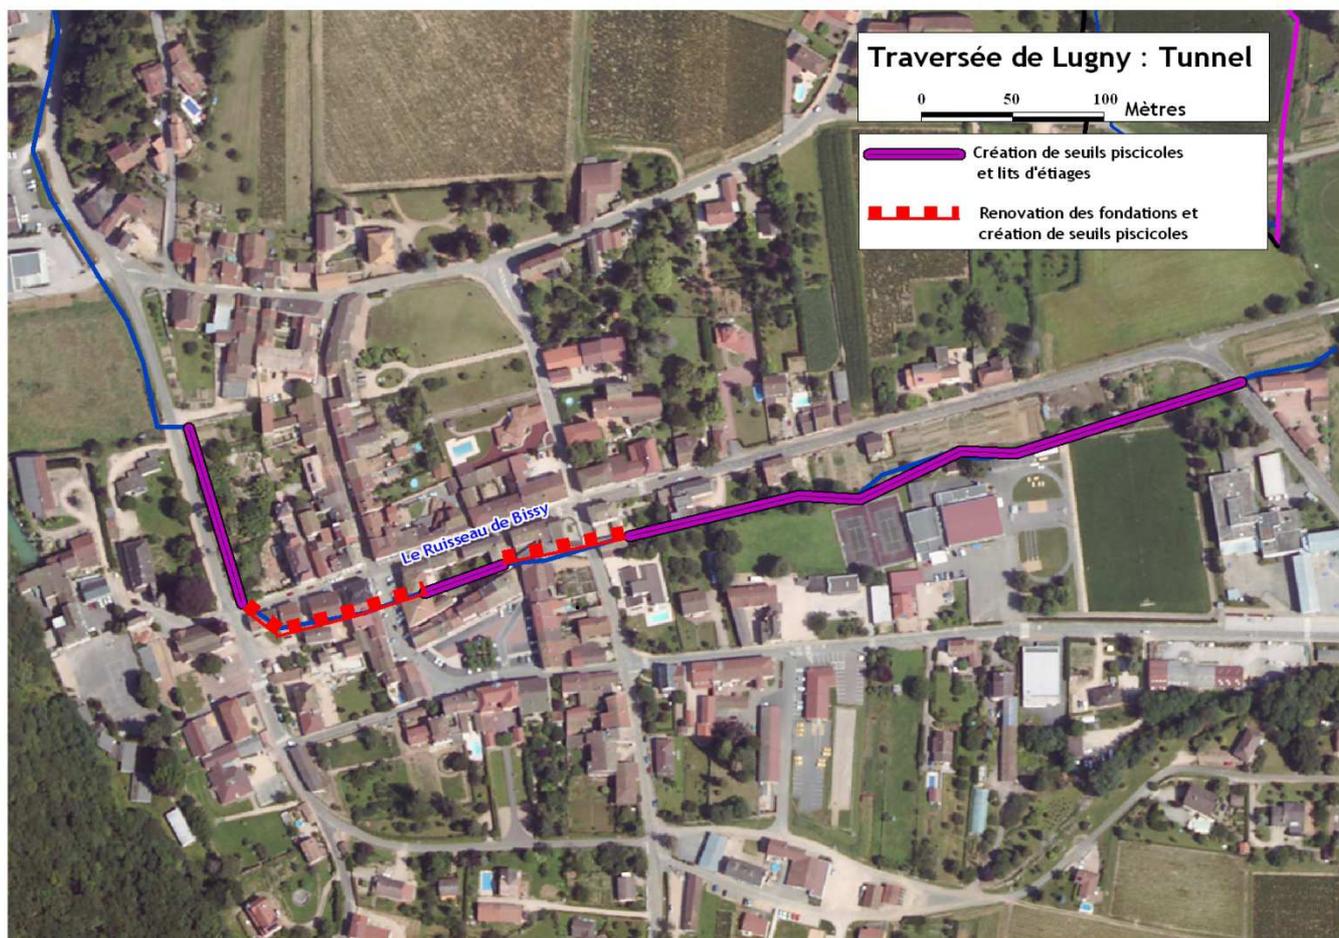

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Réduction du colmatage

- Augmentation des indices biologiques
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
26> Etude de définition du projet	2012	10000	11960
27> Renovation des murs de soutènement	2013	120000	143520
28> Création d'un lit d'étiage et de seuils piscicoles (voir fiche actions diversification n° B2.5-003)	2013		0
29>			0
30>			0
	Total	130000	155480

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût HT	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	10000	100 %	%	%	%	%	%
2>	2013	120000	100 %	%	%	%	%	%
3>	2013		20 %	50 %	%	30 %	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations sur le HT	130000	0	0	0	0	0
Total TTC		155480	dont	0			de financement potentiel	

Maitrise d'ouvrage

SIVOM du canton de Lugny

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
-

Volet	Protection des biens et des personnes			Code fiche action	
Thèmes	Protection individuelle			B1.3	003
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43 / 3C07
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Protection des entreprises dans la zone d'activité en amont de Lugny				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

La zone d'activité en amont de Lugny est sensible aux inondations

Objectifs :

- Evaluer le niveau de protection nécessaire par établissement
- Mettre en place des systèmes de protection individuelle
-

Conditions d'exécution :

- Définition du risque
-
-

Indicateurs d'efficacité :

-
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
11> Définition du niveau de risque de ces établissements	2012	4000	4784
12> Mise en place de protections individuelles adaptées	2013	15000	17940
13>			0
14>			0
15>			0
	Total	19000	22724

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût HT	Participation financière potentielle						
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg	CG 71	Feder	Autre
1>	2012	4000	100 %	%	%	%	%	%	%
2>	2013	15000	100 %	%	%	%	%	%	%
3>			%	%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%	%
		Participations sur le HT	19000	0	0	0	0	0	0
Total TTC		22724	dont	0			de financement potentiel		

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny et propriétaires

Conditionnement des aides :

-
-

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Gestion des berges			B2.1	014
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C17 / 3C37
ME Sup	11206	Cours d'eau	Ruisseau de Bissy et Bourbonne		
Commune(s)	Bissy / Lugny / Montbellet		Département 71		
Intitulé du projet	Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve de la Bourbonne				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

L'absence de végétation impacte la qualité du milieu aquatique directement par réchauffement. Aucune végétation de renouvellement n'est en place pour régénérer la ripisylve.

Objectifs :

- Replanter les secteurs nus
- Densifier les secteurs clairsemés
- Pose de clôtures et d'abreuvoirs

Plan de situation

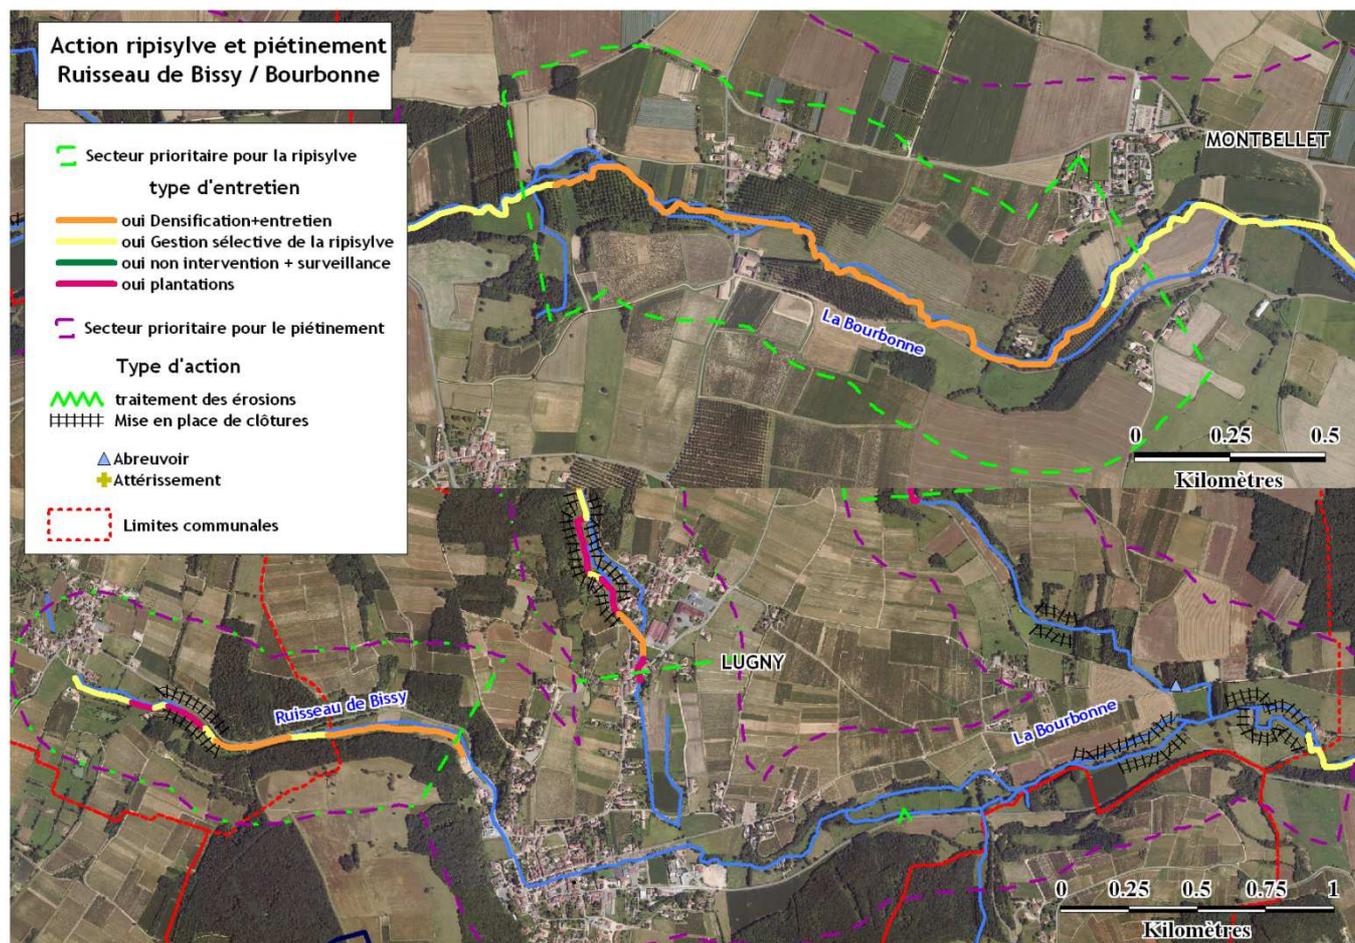

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires ou DIG
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration des indices biologiques
- Réduction de la température de l'eau
- Restaurer la ripisylve et limiter le colmatage dû au piétinement

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

66> Plantation, densification, entretien, gestion de la renouée
 67> Pose de clôtures et d'abreuvoirs dans les secteurs sensibles au colmatage
 68>
 69>
 70>

Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
2013	61500	73554
2014	17700	21169
	0	0
		0
		0
Total	79200	94723

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2013	61500	40 %	30 %	%	30 %	%	%
2>	2014	17700	20 %	30 %	%	50 %	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	28140	23760	0	27300	0	0
Total TTC		94723	dont	51060			de participations	

Maitrise d'ouvrage**Sivom du canton de Lugny / AAPPMA****Conditionnement des aides :**

- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Gestion des berges			B2.1	015
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C17 / 3C37
ME Sup	11206	Cours d'eau	L'Ail et Fissy		
Commune(s)	Cruzille / Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve de l'Ail et du ruisseau de Fissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :


L'absence de végétation impacte la qualité du milieu aquatique directement par réchauffement. Aucune végétation de renouvellement n'est en place pour régénérer la ripisylve.

Objectifs :

- Replanter les secteurs nus
- Densifier les secteurs clairsemés
- Pose de clôtures et d'abreuvoirs

Plan de situation

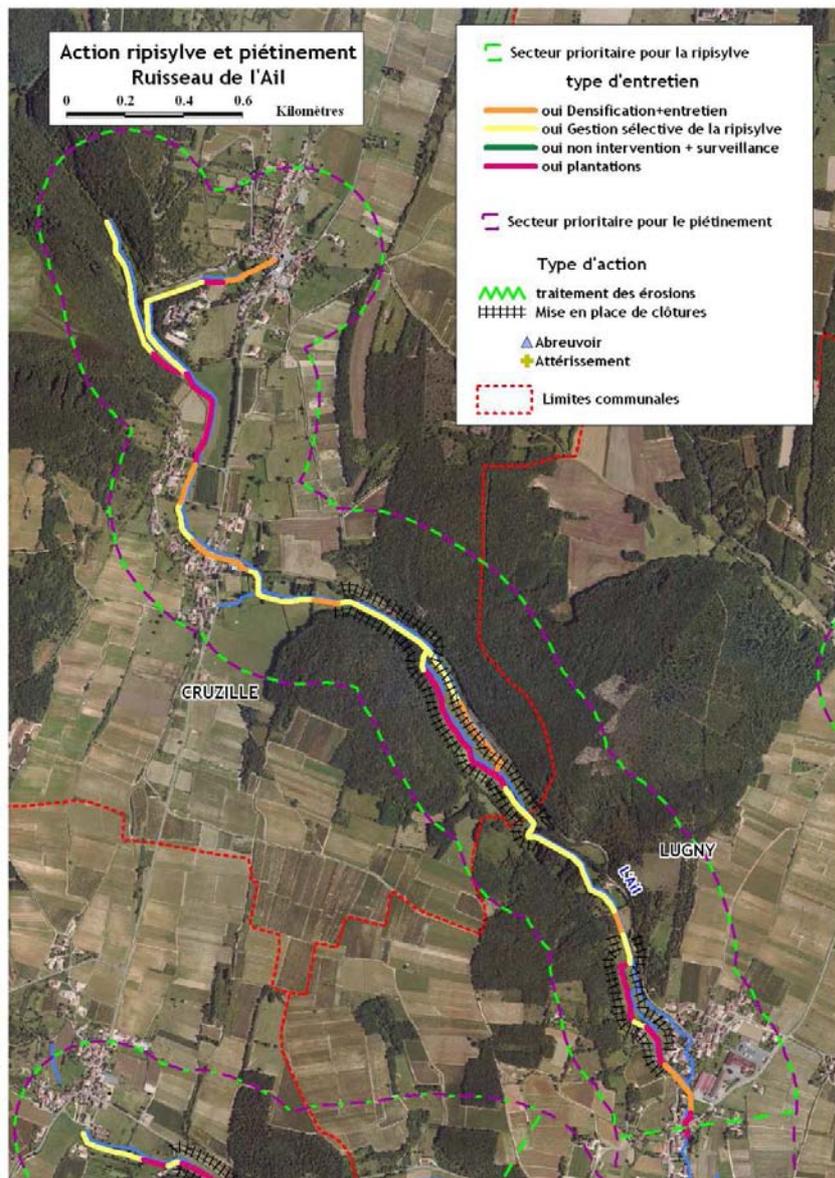

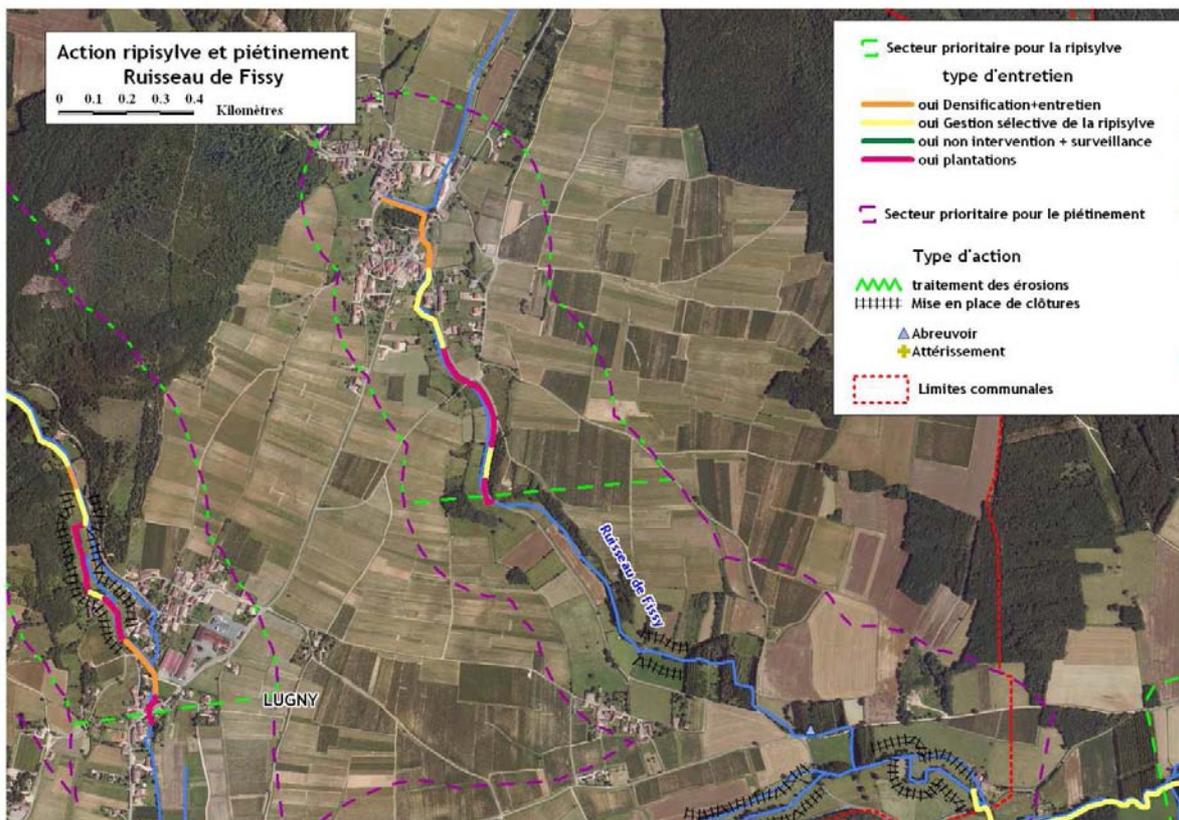

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires ou DIG

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration des indices biologiques
- Réduction de la température de l'eau
- Restaurer la ripisylve et limiter le colmatage dû au piétinement

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)

- 71> Plantation, densification, entretien, gestion de la renouée
- 72> Pose de clôtures et d'abreuvoirs dans les secteurs sensibles au colmatage
- 73>
- 74>

Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
2013	70500	84318
2014	27700	33129
	0	0
		0
Total	98200	117447

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2013	70500	40 %	30 %	%	30 %	%	%
2>	2014	27700	20 %	30 %	%	50 %	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
		Participations	33740	29460	0	35000	0	0
Total TTC		117447	dont	64460			de participations	

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / AAPPMA

Conditionnement des aides :

- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Gestion des berges			B2.1	016
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C17 / 3C37
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Gravaise		
Commune(s)	Montbellet		Département 71		
Intitulé du projet	Mise en œuvre du plan de gestion de la ripisylve de la Gravaise				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

L'absence de végétation impacte la qualité du milieu aquatique directement par réchauffement. Aucune végétation de renouvellement n'est en place pour régénérer la ripisylve.

Objectifs :

- Replanter les secteurs nus
- Densifier les secteurs clairsemés
- Pose de clôtures et d'abreuvoirs

Plan de situation

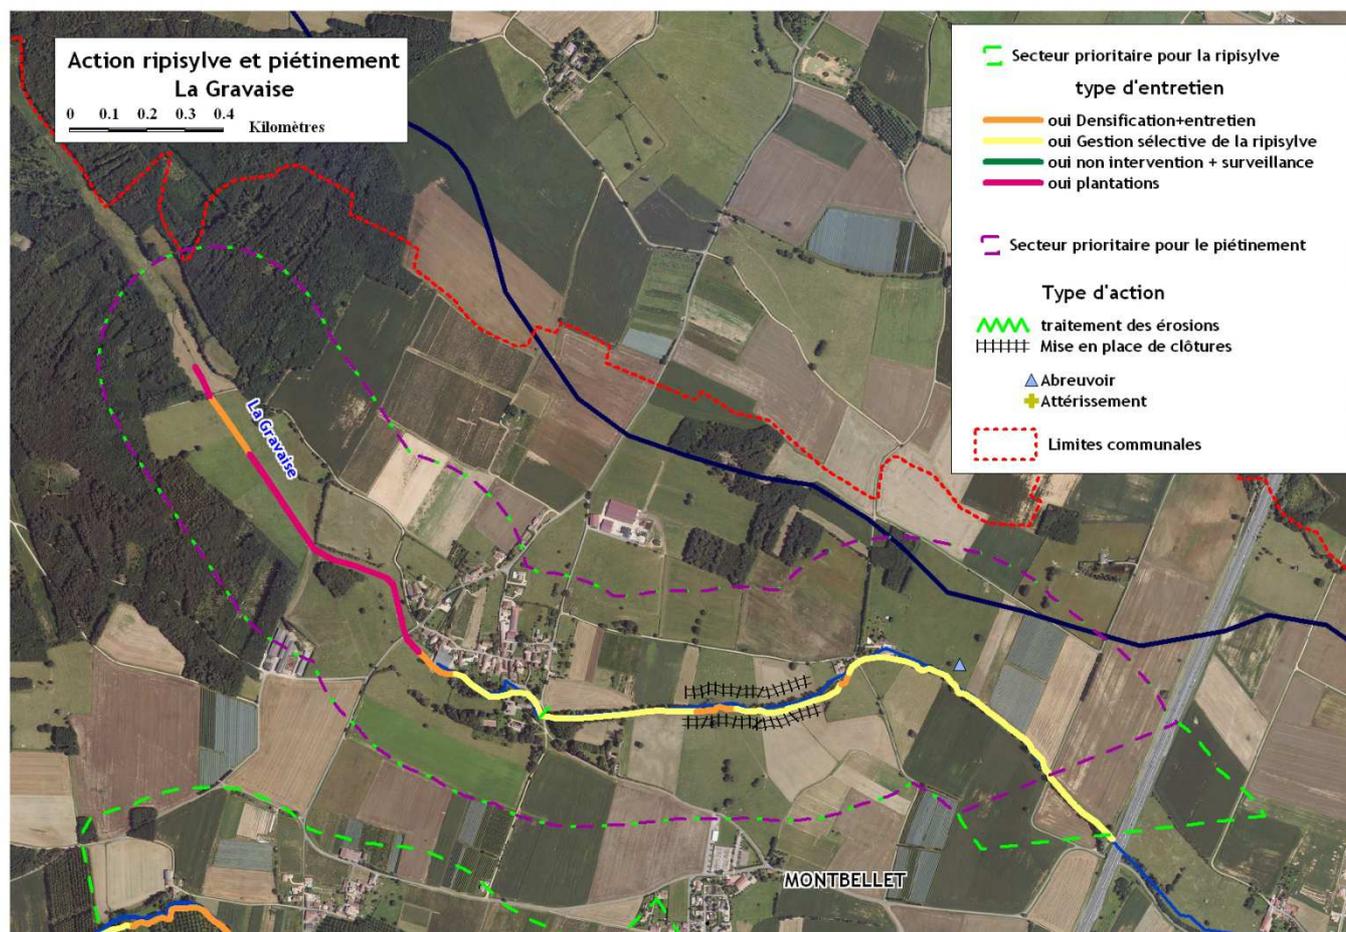

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires ou DIG
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration des indices biologiques
- Réduction de la température de l'eau
- Restaurer la ripisylve et limiter le colmatage dû au piétinement

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
75> Plantation, densification, entretien, gestion de la renouée	2015	32700	39109
76> Pose de clôtures et d'abreuvoirs dans les secteurs sensibles au colmatage	2014	7000	8372
77>			0
78>			0
79>			0
Total		39700	47481

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2015	32700	40 %	30 %	%	30 %	%	%
2>	2014	7000	20 %	30 %	%	50 %	%	%
3>			%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	14480	11910	0	13310	0	0
Total TTC		47481	dont	25220			de participations	

Maitrise d'ouvrage**Sivom du canton de Lugny****Conditionnement des aides :**

- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Ouvrages et continuité			B2.3	025
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Cruzille / Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Amélioration de la continuité du ruisseau de l'Ail				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de l'Ail situé en tête de bassin est cloisonné et artificialisé

Objectifs :

- Favoriser la continuité et le secteur de reproduction de la Truite
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire

Plan de situation

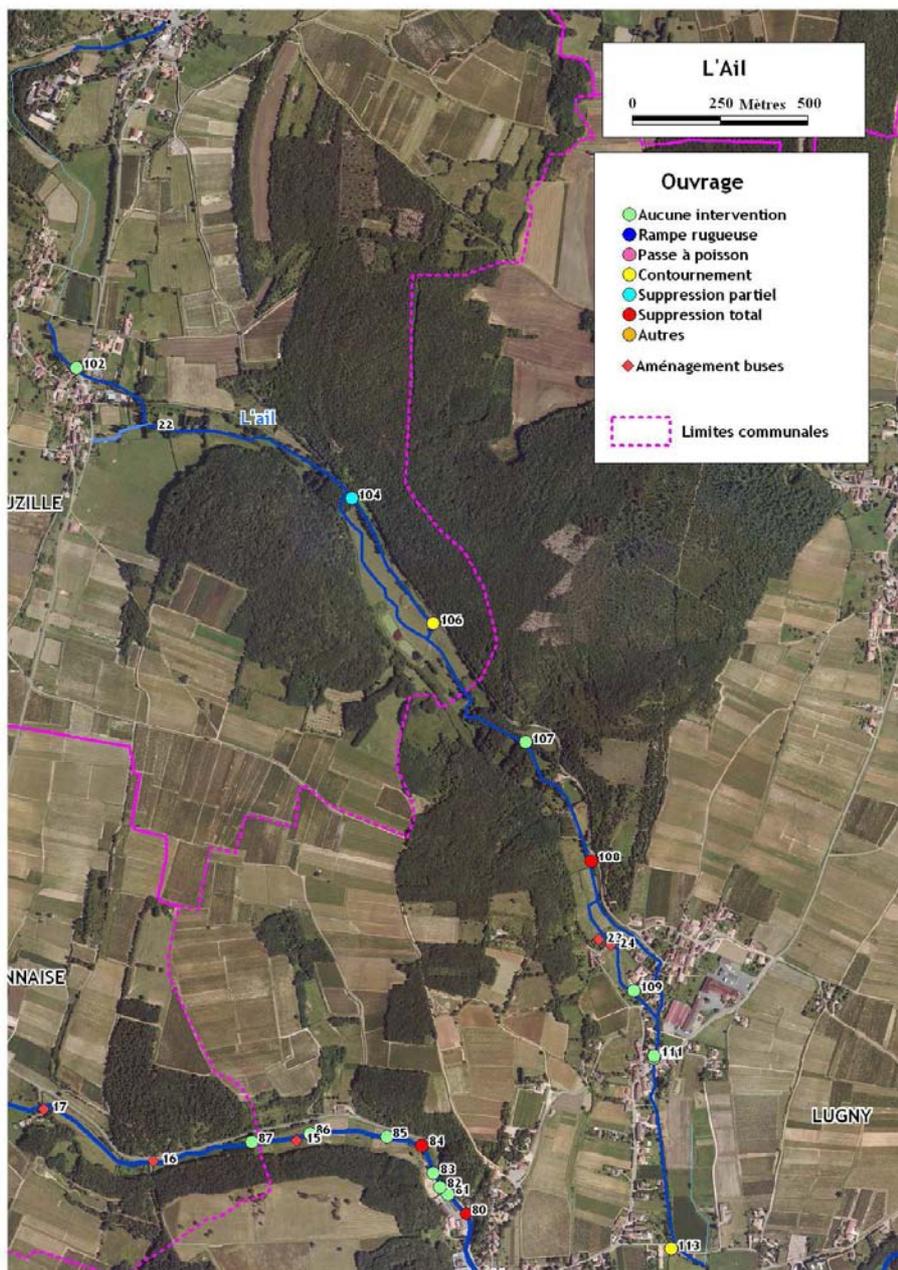

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
121> Aménagement des buses n° 23 -24	2012	16000	19136
122> Aménagement des seuils n° 104 - 107 - 108 - 7ter	2012	6000	7176
123>			0
124>			0
125>			0
Total		22000	26312

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	19136	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2012	7176	20 %	50 %	%	30 %	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	4400	11000	0	6600	0	0
Total		26312	dont	17600			de participations	

Maitrise d'ouvrage*Sivom du canton de Lugny / Bourbonne***Conditionnement des aides :**

- Approche globale nécessaire
-

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Ouvrages et continuité			B2.3	026
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
ME Sup	11206	Cours d'eau	Ruisseau de Fissy		
Commune(s)	Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Aménagement de la continuité du ruisseau de Fissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de Fissy est cloisonné et artificialisé

Objectifs :

- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire

Plan de situation

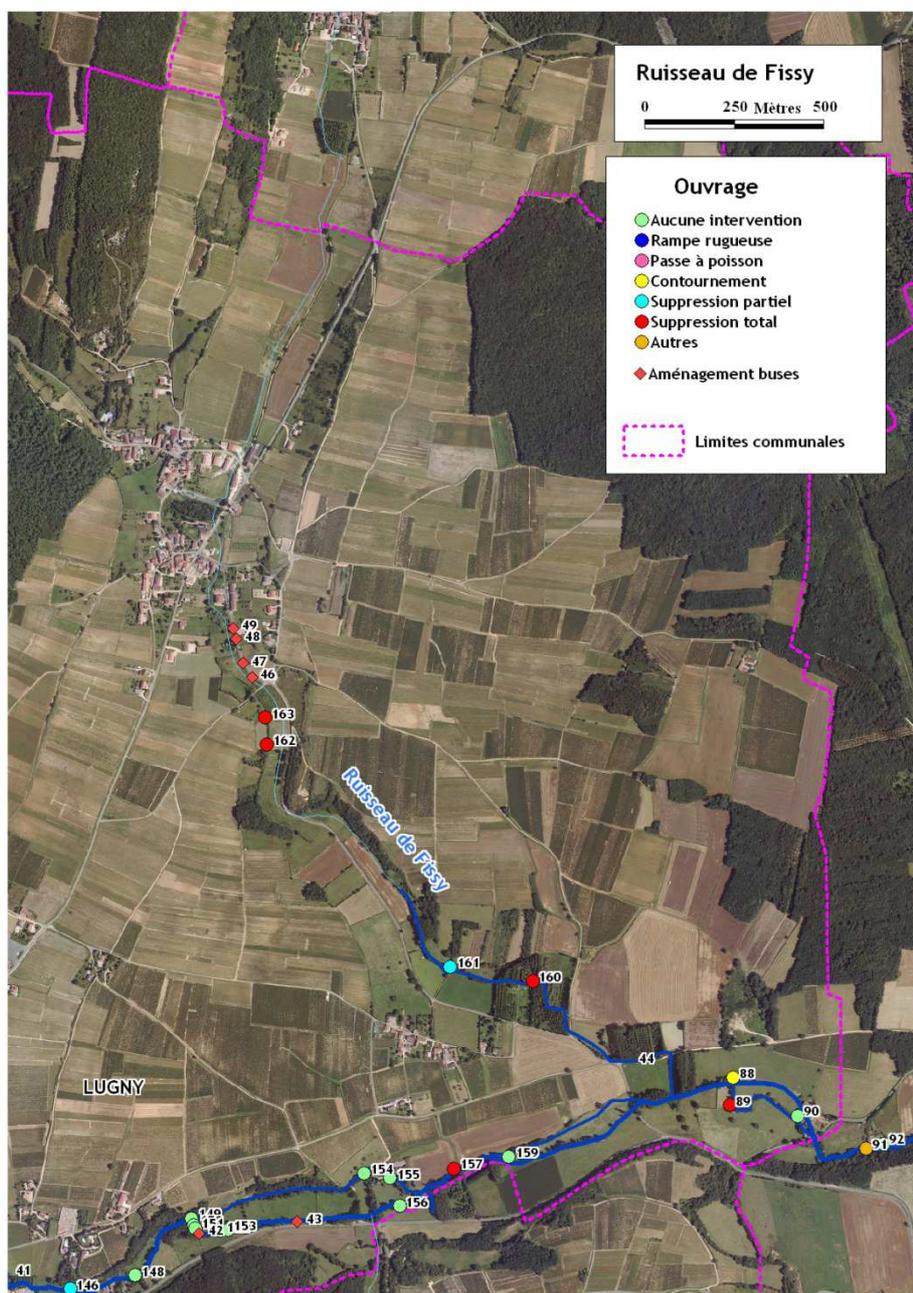

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
126> Aménagement des ouvrages n° 160 - 161 - 162 - 163	2013	8600	10286
127> Aménagement des buses n° 46 - 47 - 48 - 49	2013	32000	38272
128>			0
129>			0
130>			0
Total		40600	48558

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2013	10286	%	50 %	%	30 %	%	20 %
2>	2013	38272	%	50 %	%	30 %	%	20 %
3>		0	%	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	0	20300	0	12180	0	8120
Total		48558	dont	40600			de participations	

Maitrise d'ouvrage*Fédération de pêche de Saône et Loire***Conditionnement des aides :**

- Approche globale nécessaire
-

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Ouvrages et continuité			B2.3	027
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3A28 / 3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Bissy la Mâconnaise / Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Aménagement de la continuité du ruisseau de Bissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de Bissy est cloisonné et artificialisé

Objectifs :

- Favoriser la continuité et le secteur de reproduction de la Truite
- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire

Plan de situation

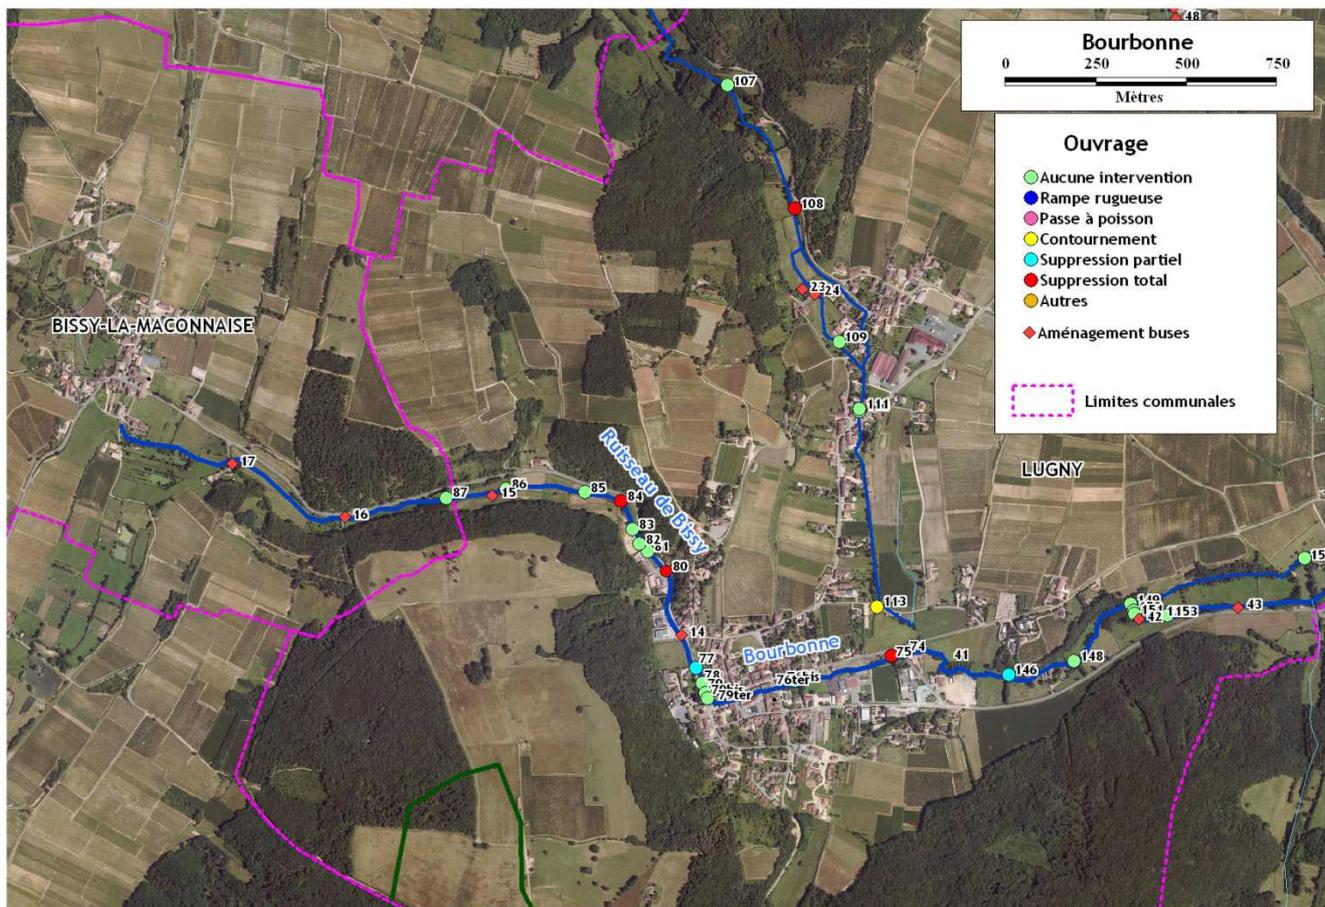

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
	131> Aménagement des buses n° 14 - 15 - 16 - 17	2012	32000
132> Aménagement des seuils fixes n° 75 - 76 - 77 - 80 - 84	2012	15300	18299
133>			0
134>			0
135>			0
Total		47300	56571

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	38272	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2012	18299	20 %	50 %	%	30 %	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	9460	23650	0	14190	0	0
Total		56571	dont	37840		de participations		

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
-

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Ouvrages et continuité			B2.3	028
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3A28 / 3C07 / 3C11 / 3C12 / 3C13
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Lugny / Montbellet		Département 71		
Intitulé du projet	Aménagement de la continuité du ruisseau de la Bourbonne				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

La Bourbonne est cloisonnée et artificialisée

Objectifs :

- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire
-

Plan de situation

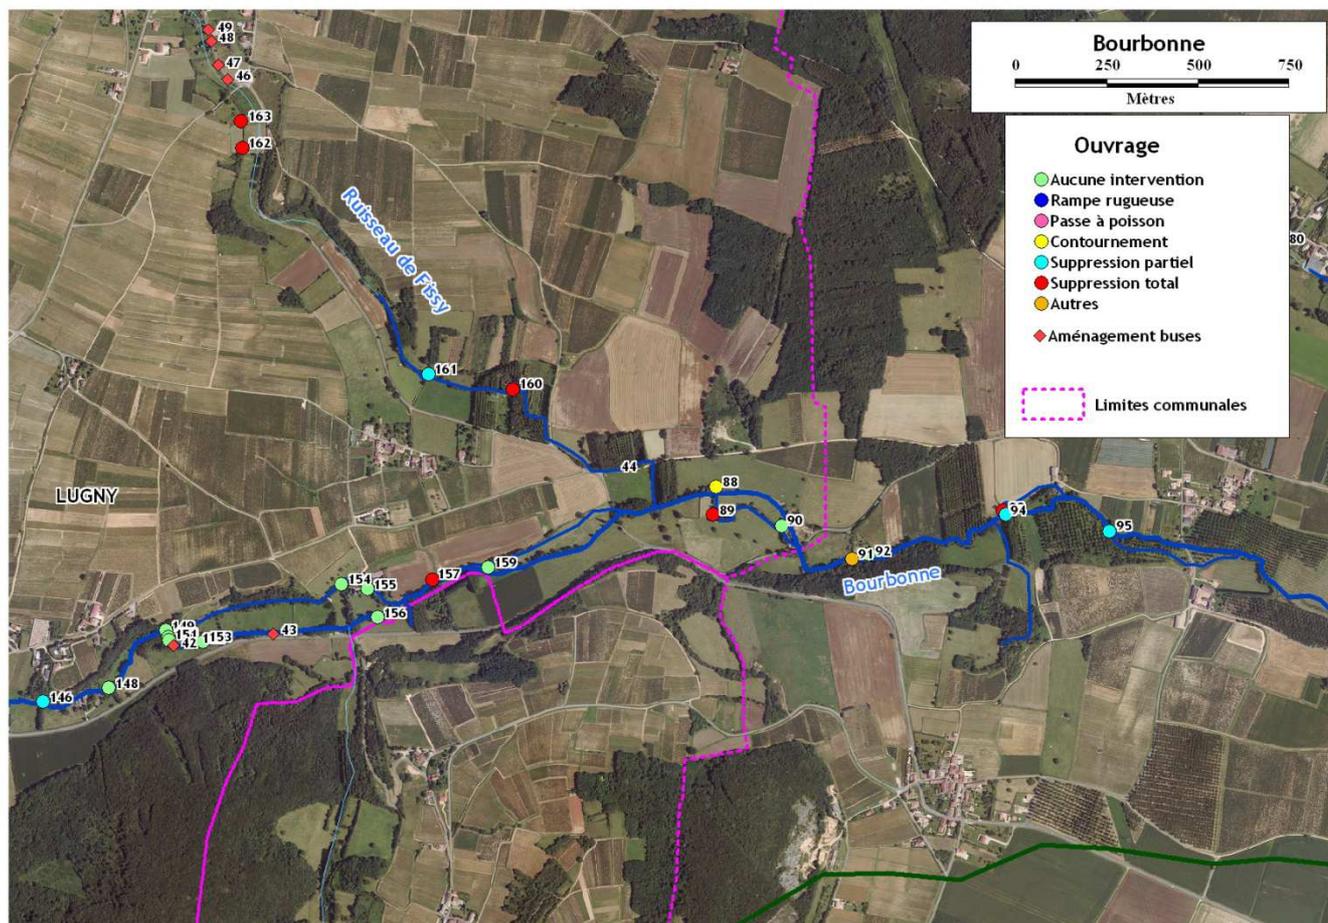

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
	136> Aménagement des buses n° 18 - 42 - 43	2013	24000
137> Aménagement des seuils fixes n° 88 - 90	2013	28600	34206
138> Aménagement des ouvrages n° 91 - 93- 94 - 95 - 146 - 157	2014	48700	58245
139>			0
140>			0
Total		101300	121155

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2013	28704	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2013	34206	20 %	50 %	%	30 %	%	%
3>	2014	58245	20 %	50 %	%	30 %	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	20260	50650	0	30390	0	0
Total		121155	dont	81040			de participations	

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
-

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Ouvrages et continuité			B2.3	029
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C11 / 3C12 / 3C13
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Gravaise		
Commune(s)	Montbellet		Département 71		
Intitulé du projet	Aménagement de la continuité du ruisseau de la Gravaise				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

La Gravaise est cloisonnée, artificialisée et colmatée

Objectifs :

- Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire

Plan de situation

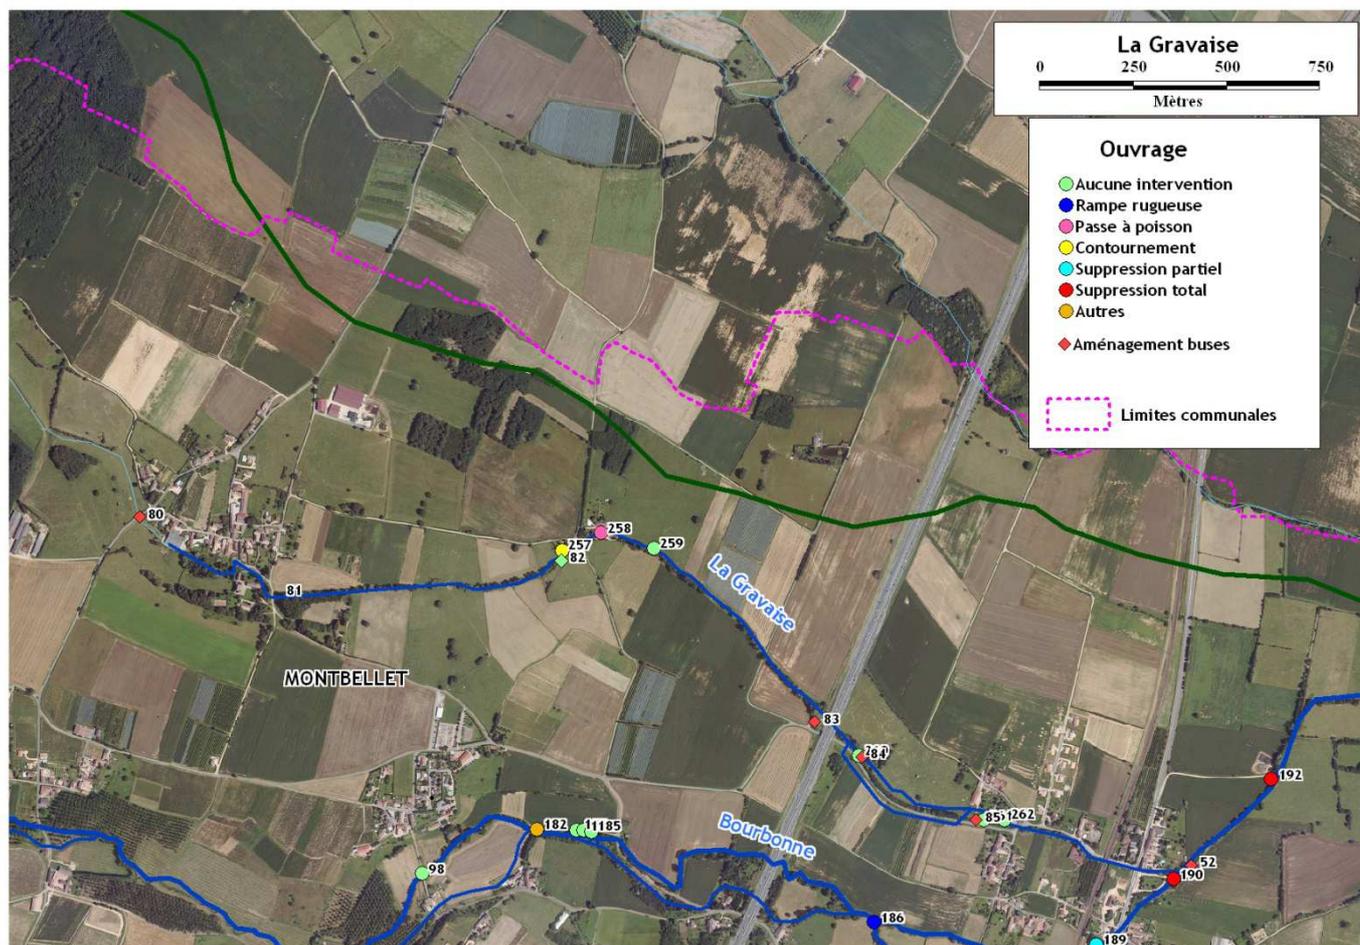

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
141> Aménagement des ouvrages n° 259 et des buses n° 80 - 83	2015	16000	19136
142> Aménagement des buses n° 84 - 85	2016	16000	19136
143>			0
144>			0
145>			0
	Total	32000	38272

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2015	19136	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2016	19136	20 %	50 %	%	30 %	%	%
3>		0	%	%	%	%	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	6400	16000	0	9600	0	0
Total		38272	dont	25600		de participations		

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire

-

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Restauration physique			B2.4	011
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43 / 3C07
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Cruzille		Département 71		
Intitulé du projet	Restauration au lagunage de Cruzille				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de l'Ail a été dérivé à hauteur de la lagune de Cruzille et est très peu diversifié

Objectifs :

- Définition du projet
- Restauration de l'Ail

Plan de situation

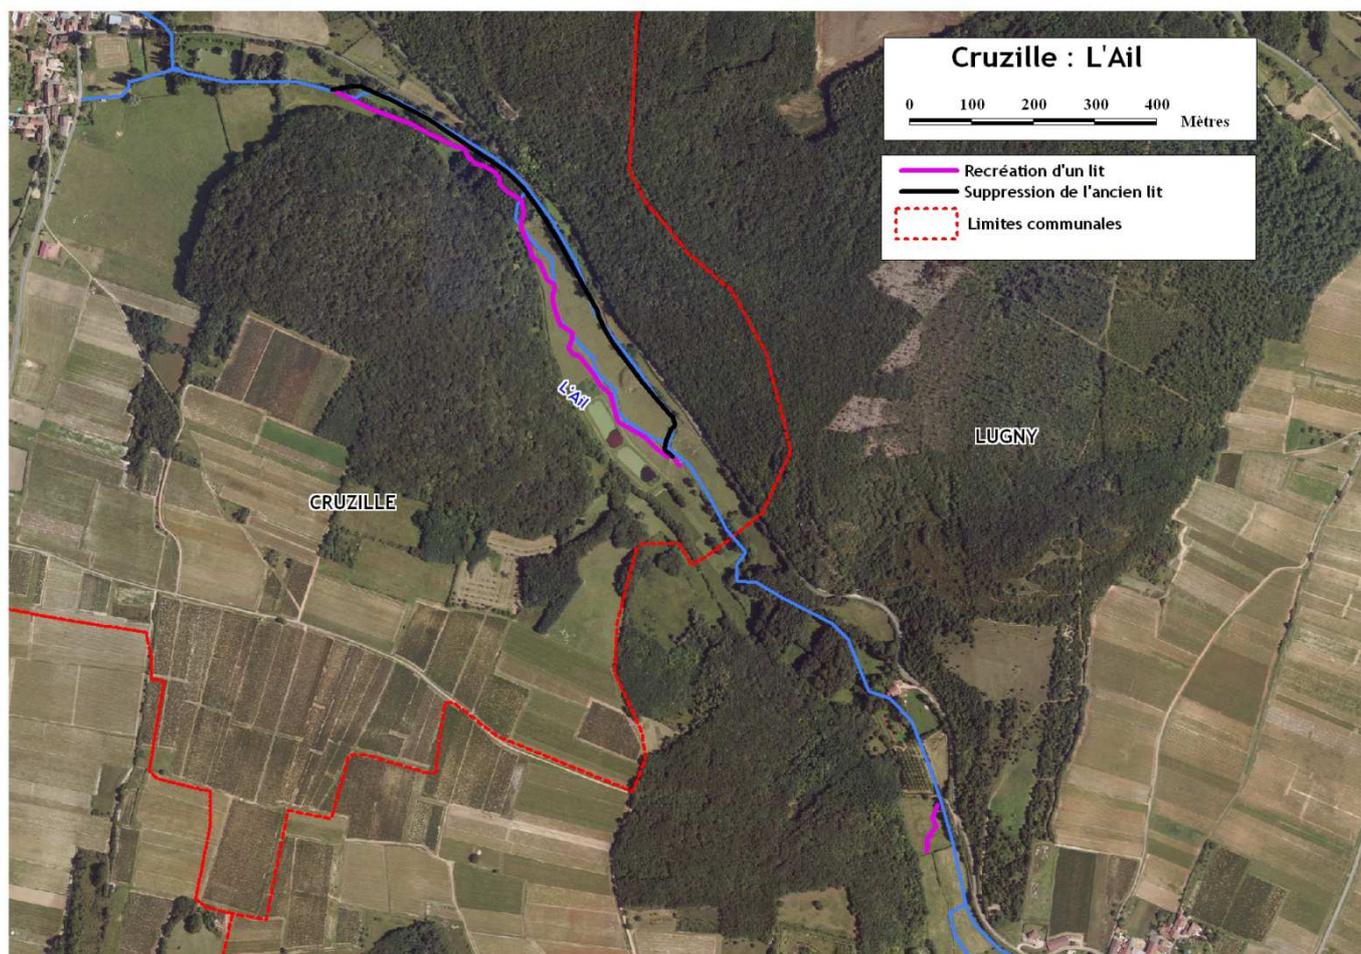

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage
- Augmentation des indices biologiques

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
51> Etude de définition du projet	2012	10000	11960
52> Acquisition foncière	2013	5000	5980
53> Mise en œuvre de la restauration	2013	105220	125843
54>			0
55>			0
Total		120220	143783

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	11960	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2013	5980	20 %	50 %	%	30 %	%	%
3>	2013	125843	20 %	50 %	%	30 %	%	%
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	24044	60110	0	36066	0	0
Total		143783	dont	96176			de participations	

Maitrise d'ouvrage**Sivom du canton de Lugny****Conditionnement des aides :**

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Restauration physique			B2.4	012
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43 / 3C07
ME Sup	11206	Cours d'eau	Le Ruisseau de Fissy		
Commune(s)	Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Restauration à Fissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de Fissy a été rectifié

Objectifs :

- Définition du projet
- Restauration du ruisseau de Fissy

Plan de Situation

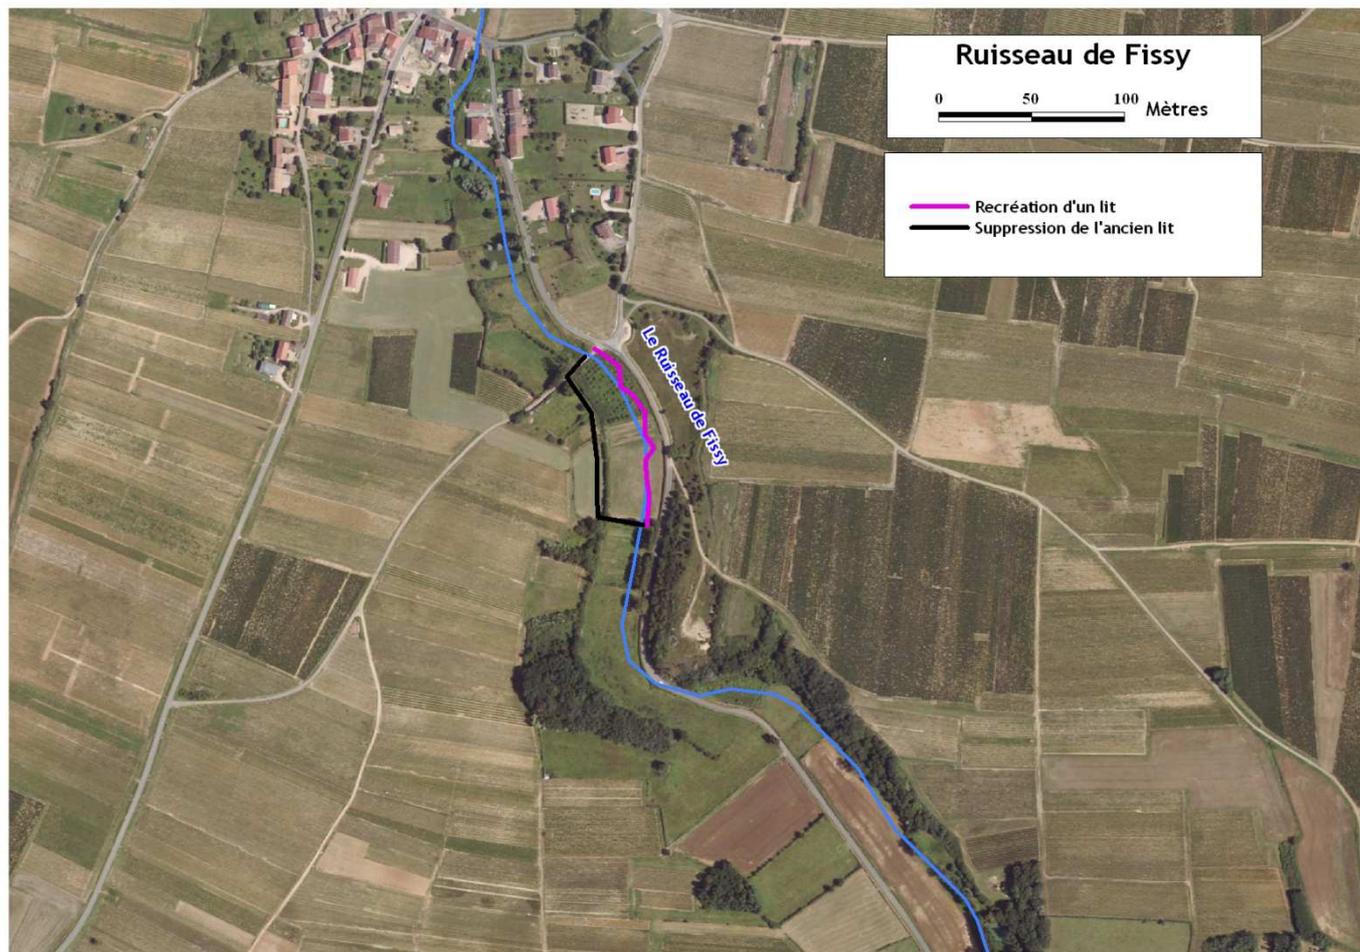

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Meilleure circulation piscicole et sédimentaire
- Limitation du colmatage
- Augmentation des indices biologiques

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
56> Etude de définition du projet	2012	5000	5980
57> Acquisition foncière	2013	3000	3588
58> Mise en œuvre de la restauration	2014	19250	23023
59>			0
60>			0
Total		27250	32591

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR BG / Feder	CG 71	Autre
1>	2012	5980	20 %	50 %	%	30 %	%	20 %
2>	2013	3588	20 %	50 %	%	30 %	%	%
3>	2014	23023	%	50 %	%	30 %	%	20 %
4>		0	%	%	%	%	%	%
5>		0	%	%	%	%	%	%
		Participations	1600	13625	0	8175	0	4850
Total		32591	dont	26650			de participations	

Maitrise d'ouvrage**Fédération de Pêche de Saône et Loire****Conditionnement des aides :**

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Diversification			B2.5	012
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43
ME Sup	11206	Cours d'eau	L'Ail		
Commune(s)	Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Diversification des habitats du ruisseau de l'Ail				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de l'Ail a été profilé et rectifié, il présente un aspect uniforme et très pauvre. La partie basse est urbanisée

Objectifs :

- Création de lit d'étiage

Carte de situation :

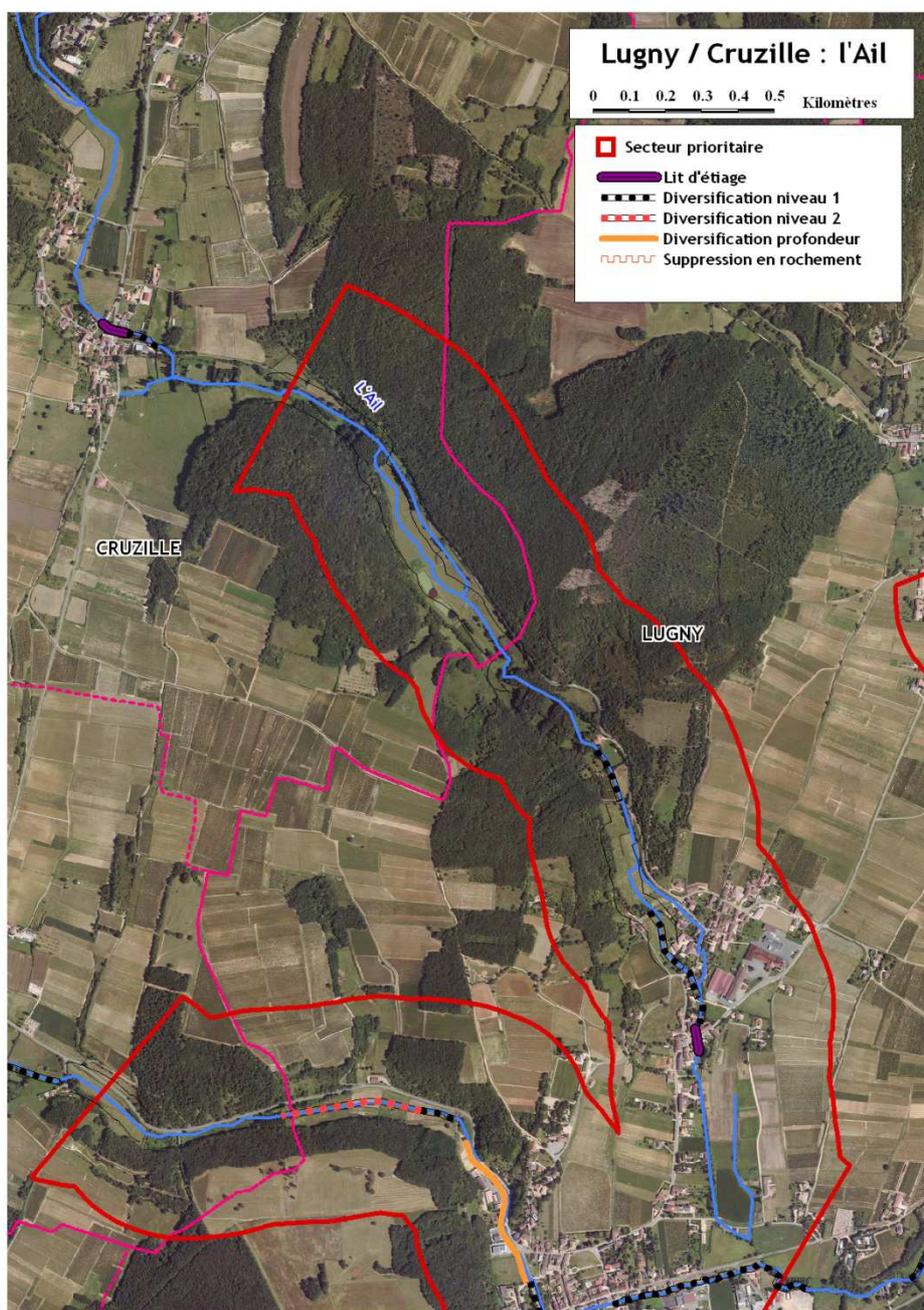

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Multiplication des habitats
- Augmentation des indices biologiques
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF**Coût prévisionnel (en €)**

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
56> Diversification du lit par des déflecteurs	2013	14940	17868
57>			0
58>			0
59>			0
60>			0
Total		14940	17868

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2013	14940	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>			%	%	%	%	%	%
3>			%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	2988	7470	0	4482	0	0
Total TTC		17868	dont	11952			de participations	

Maitrise d'ouvrage*Sivom du canton de Lugny / Bourbonne***Conditionnement des aides :**

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Diversification			B2.5	013
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43
ME Sup	11206	Cours d'eau	Ruisseau de Fissy		
Commune(s)	Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Diversification des habitats du ruisseau de Fissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de Fissy a été profilé et rectifié, il présente un aspect uniforme et très pauvre.

Objectifs :

- Diversification des fonds

Plan de situation

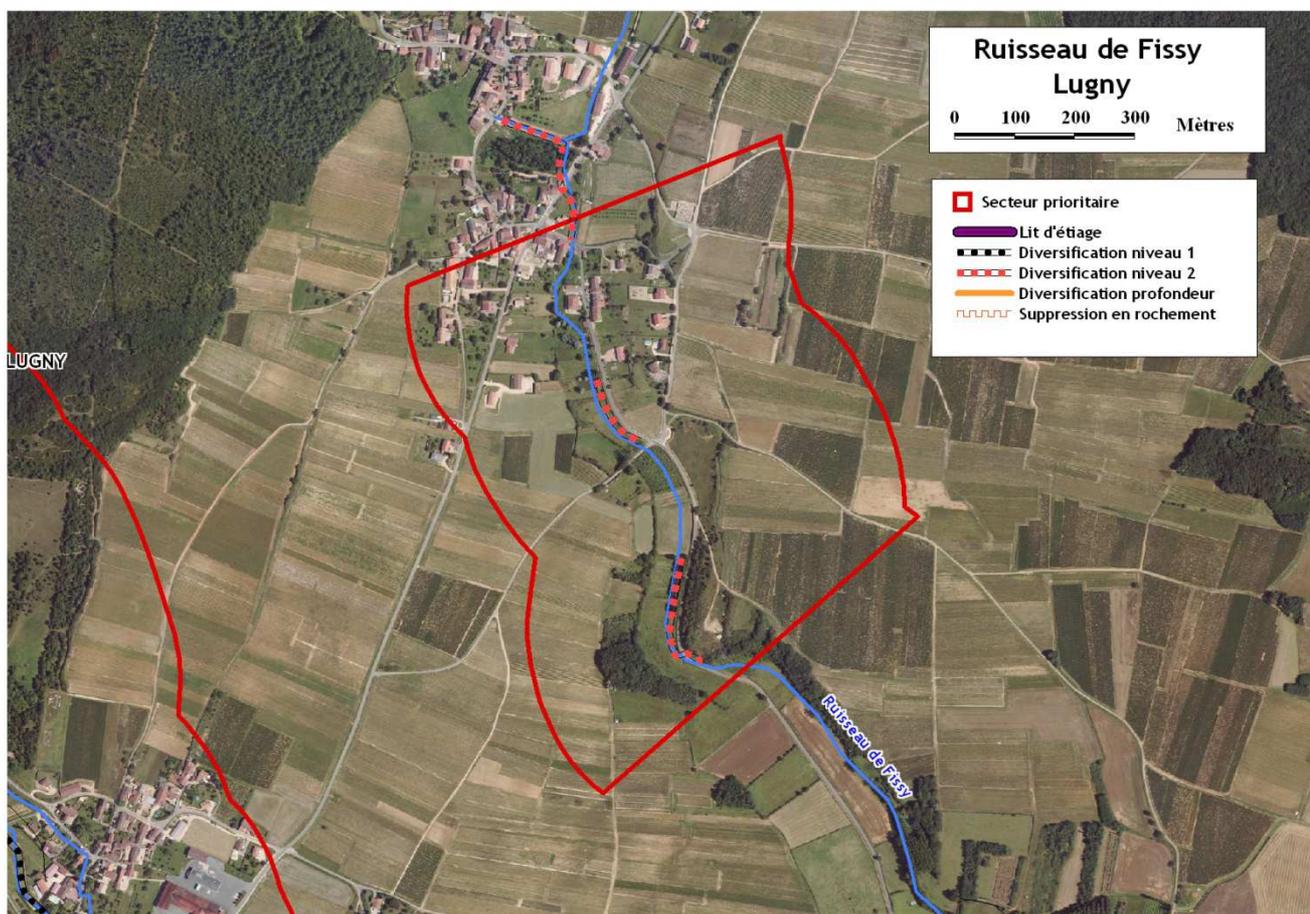

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Multiplication des habitats
- Augmentation des indices biologiques

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
61> Diversification du lit par fagot, petits seuils piscicoles ou déflecteurs	2013	34700	41501
62>			0
63>			0
64>			0
65>			0
	Total	34700	41501

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2013	34700	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>			%	%	%	%	%	%
3>			%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	6940	17350	0	10410	0	0
Total TTC		41501	dont	27760			de participations	

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Diversification			B2.5	014
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43
ME Sup	11206	Cours d'eau	Ruisseau de Bissy		
Commune(s)	Bissy la Mâconnaise / Lugny		Département 71		
Intitulé du projet	Diversification des habitats du ruisseau de Bissy				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

Le ruisseau de Bissy a été profilé et rectifié, il présente un aspect uniforme et très pauvre. La partie basse est urbanisée

Objectifs :

- Création de lit d'étiage
- Diversification des fonds
- Reprofiler les lits, et créer une banquette d'inondation

Plan de situation

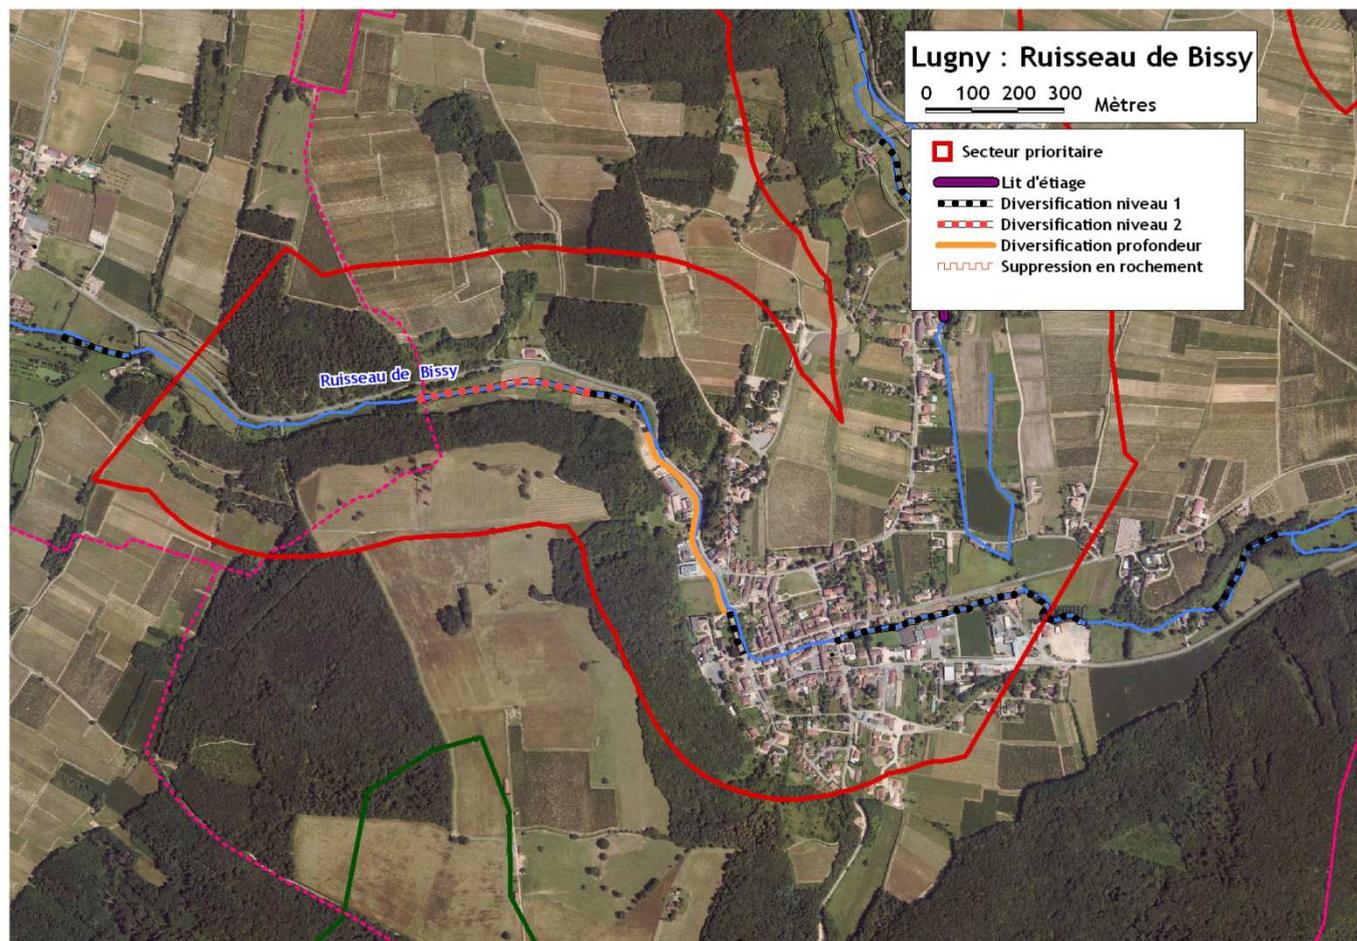

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires

Indicateurs d'efficacité :

- Multiplication des habitats
- Augmentation des indices biologiques
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €) 66> Reprofilage du lit et création d'une banquettes d'inondation 67> Diversification du lit par fagot, petits seuils piscicoles ou déflecteurs 68> Traitement des érosions le long de la D55 69> 70>	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
	2012	44300	52983
	2014	24300	29063
	2015	9000	10764
			0
		0	
Total	77600	92810	

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle						
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre	
1>	2012	44300	20 %	50 %	%	30 %	%	%	
2>	2014	24300	70 %	30 %	%	%	%	%	
3>	2015	9000	30 %	70 %	%	%	%	%	
4>			%	%	%	%	%	%	
5>			%	%	%	%	%	%	
		Participations	28570	35740	0	13290	0	0	
Total TTC		92810	dont				de participations		

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Diversification			B2.5	015
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)	Montbellet		Département 71		
Intitulé du projet	Diversification des habitats de la Bourbonne				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

La Bourbonne dans la traversée de Montbellet, est très artificialisée. Le cours d'eau se divise en plusieurs bras et les axes de communication contraignent la rivière.

Objectifs :

- Création de lit d'étiage
- Diversification des fonds

Plan de situation

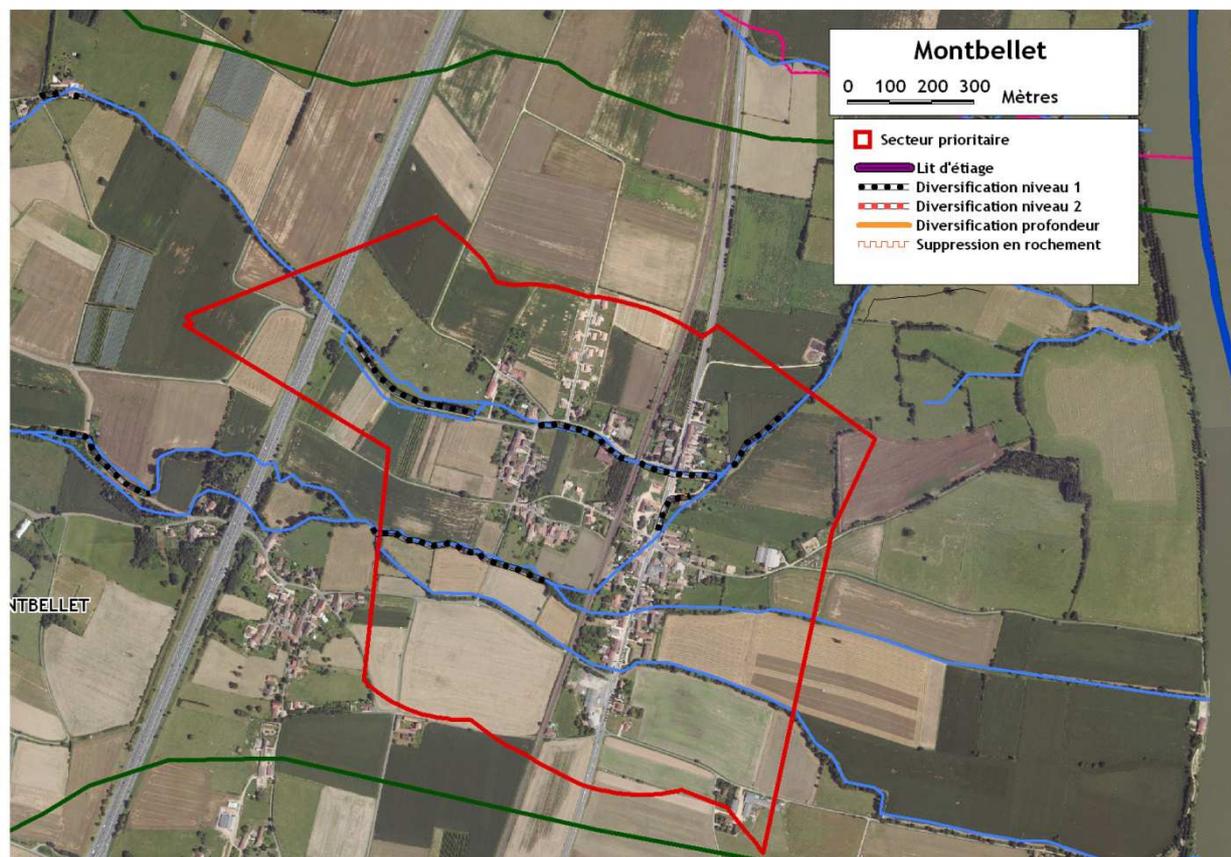

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Multiplication des habitats
- Augmentation des indices biologiques
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
71> Diversification du lit par fagot, petits seuils piscicoles ou déflecteurs	2014	22620	27054
72> Création d'un lit d'étiage (franchissement de l'A6)	2015	16000	19136
73> Suppression de l'enrochement (St Oyen)	2016	1200	1435
74>			0
75>			0
	Total	39820	47625

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2014	22620	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2015	16000	70 %	30 %	%	%	%	%
3>	2016	1200	30 %	70 %	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	16084	16950	0	6786	0	0
Total TTC		47625	dont	23736			de participations	

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Diversification			B2.5	016
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C43
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Gravaise		
Commune(s)	Montbellet		Département 71		
Intitulé du projet	Diversification des habitats du ruisseau de Gravaise				

CONTEXTE


Problèmes identifiés :

La Gravaise traverse le Hameau de St Oyen et rejoint la Bourbonne. Ce secteur est très artificialisé.

Objectifs :

- Création de lit d'étiage
- Diversification des fonds

Plan de situation

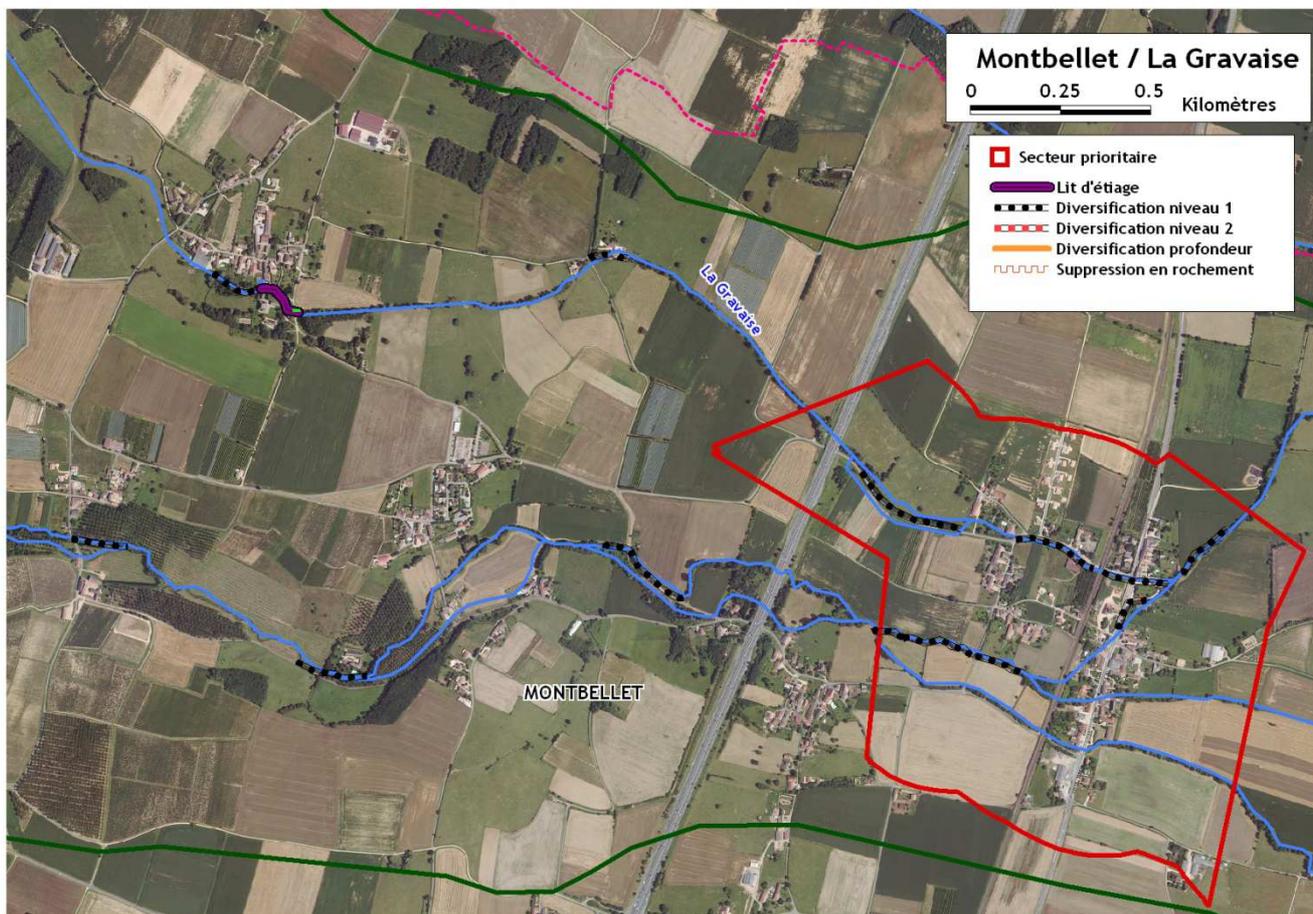

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Multiplication des habitats
- Augmentation des indices biologiques
-

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
76> Diversification du lit par fagot, petits seuils piscicoles ou déflecteurs	2015	22800	27269
77> Création d'un lit d'étiage + franchissement	2015	37700	45089
78> Protection de berge	2016	3400	4066
79>			0
80>			0
	Total	63900	76424

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût TTC	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2015	22800	20 %	50 %	%	30 %	%	%
2>	2015	37700	70 %	30 %	%	%	%	%
3>	2016	3400	30 %	70 %	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	31970	25090	0	6840	0	0
Total TTC		76424	dont	31930		de participations		

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny / Bourbonne

Conditionnement des aides :

- Approche globale nécessaire
- Bonification possible selon ambition

Volet	Fonctionnement physique et biologique			Code fiche action	
Thèmes	Gestion des berges			B3.4	003
Bassin versant	La Bourbonne			Mesures du PDM	3C17 / 3C37
ME Sup	11206	Cours d'eau	La Bourbonne		
Commune(s)			Département 71		
Intitulé du projet	Gestion des peupliers en bord de cours d'eau				

CONTEXTE

Problèmes identifiés :

Des plantations de peupliers en bord de cours d'eau peuvent être réaménagées en zones humides fonctionnelles.

Objectifs :

- Restaurer une végétation type ripisylve
- Limiter la réimplantation en berge

Plan de situation

Conditions d'exécution :

- Accord des propriétaires ou DIG
-
-

Indicateurs d'efficacité :

- Amélioration des indices biologiques
- Réduction de la température de l'eau
- Restaurer la ripisylve et limiter le colmatage

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût prévisionnel (en €)

	Prévision	Coût H.T.	Coût T.T.C.
11> Aménagement des berges en peupliers	2014	17000	20332
12>			0
13>			0
14>			0
15>			0
Total		17000	20332

Plan de financement et clé de répartition :

	Année	Coût HT	Participation financière potentielle					
			M.O.	AE RMC	Etat	CR Bg / Feder	CG 71	Autre
1>	2014	17000	40 %	30 %	%	30 %	%	%
2>			%	%	%	%	%	%
3>			%	%	%	%	%	%
4>			%	%	%	%	%	%
5>			%	%	%	%	%	%
		Participations	6800	5100	0	5100	0	0
Total TTC		20332	dont	10200			de participations	

Maitrise d'ouvrage

Sivom du canton de Lugny

Conditionnement des aides :

-
-

